



ИТОГОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
мониторинга эффективности реализации
социальных проектов, получивших
грантовую поддержку в рамках
государственной грантовой программы
«Партнерство» в 2018 году

г. Красноярск,
декабрь 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Список сокращений
2. Резюме отчета
3. Краткая информация по методологии мониторинга эффективности реализации социальных проектов, получивших финансовую поддержку в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство»
 - 3.1. Общий подход
 - 3.2. Респондентные методы
 - 3.3. Нереспондентные методы
4. Технология работы и критерии оценки эффективности проектов-победителей
5. **Общие выводы по оценке проектов**
 - 5.1. Результаты мониторинга по критерию «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части сроков реализации
 - 5.2. Результаты мониторинга по критерию «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части количества мероприятий
 - 5.3. Результаты мониторинга по критерию «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части количественного состава целевой группы
 - 5.4. Результаты мониторинга по критерию «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части количества партнеров
 - 5.5. Результаты мониторинга по критерию «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части достигнутых результатов
 - 5.6. Результаты мониторинга по критерию «Социальная эффективность реализованных проектов»
 - 5.7. Результаты мониторинга по критерию «Ресурсная эффективность реализованных проектов»
 - 5.8. Результаты мониторинга по критерию «Информационная эффективность реализованных проектов»
6. **Оценка обстоятельств, повлиявших на качественную/некачественную реализацию проектов**
7. **Основные выводы и рекомендации**
8. **Список приложений:**
 - 8.1. Приложение 1 (список 169 проектов, получивших грантовую поддержку 2018 году)
 - 8.2. Приложение 2 (список 25 проектов, реализованных в 2018 году наиболее эффективно)
 - 8.3. Приложение 3 (рейтинг 169 проектов по итогам мониторинга сайта)
 - 8.4. Приложение 4 (список 56 проектов для мониторинга посредством выезда в территории их реализации)
 - 8.5. Приложение 5 (Рейтинг 56 проектов по итогам мониторинга эффективности реализации социальных проектов в территориях края, посредством выезда в территории их реализации)

1 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации.

НКО - некоммерческие организации.

СМИ – средства массовой информации.

КЦПОИ – Краевой центр поддержки общественных инициатив.



2

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА

В 2018 году Краевым центром поддержки общественных инициатив (КЦПОИ) был проведен мониторинг эффективности реализации проектов-победителей конкурсов государственной грантовой программы «Партнёрство» в 2018 году (далее Программа). Мониторинг проводился в рамках работ, нацеленных на повышение эффективности механизмов финансовой поддержки общественных инициатив через повышение социальной и экономической эффективности проектов, получивших финансовую поддержку из краевого бюджета.

В 2018 году на конкурсы Программы было подано 673 социальных проекта, 169 (Приложение 1) из которых получили финансовую поддержку на общую сумму 48,1 млн руб.

673

социальных проекта
было подано

169

социальных проектов
получили
финансовую
поддержку

на общую сумму **48,1 млн руб.**


Данный отчет подготовлен на основе представленной КЦПОИ информации, полученной в результате мониторинга проектов реализованных в 2018 году грантополучателями государственной грантовой программы «Партнерство».

Мониторинг был ориентирован на выявление и обобщение достигнутых итоговых результатов 35% (56) проектов СО НКО, от общего количества проектов, получивших финансовую поддержку в конкурсах Программы в 2018 года. Кроме того, в процессе сбора информации

2

удалось получить мнения по отдельным проектам и рекомендации от самих благополучателей, сравнить их с мнением руководителей проектов, экспертов-оценщиков и в итоге сформировать краткие рекомендации.

Информантами стали **56** руководителей и сотрудников некоммерческих организаций, которые получили средства на реализацию социальных проектов, более **110** благополучателей по проектам-победителям, более **25** представителей организаций партнеров и экспертов.



56

руководителей
и сотрудников
некоммерческих
организаций

110

благополучателей
по проектам-
победителям

>25

представителей
организаций
партнеров и
экспертов

В ходе мониторинга были проанализированы документы и материалы проектов, публикации по ним и отзывы благополучателей, а также проведены публичные очные отчеты о реализации проектов и организованы посещения мероприятий проектов, в том числе тех, которые на момент мониторинга находились в стадии выполнения.

В ходе мониторинга было выявлено, что запланированные результаты **56** оцененных проектов СО НКО, получивших грантовую поддержку, достигнуты в более чем **60%** проектов.

Опрос благополучателей показал, что **60%** из них считают, что проекты

повысили качество их жизни и имеется положительная динамика в решении их проблем или задач, которые были в фокусах проектов. **60%** от опрошенных руководителей некоммерческих организаций посчитали, что результаты их проектов, которые были достигнуты в 2018 году более чем в половине проектов, улучшили качество жизни благополучателей и вызвали положительную динамику в решении их социальных проблем или задач.

Большинство оказанных по проектам услуг и проведенных мероприятий были эксклюзивными, то есть **60%** благополучателей отметили, что не могли бы получить эти услуги в ином месте и проекты предоставил им уникальную возможность.

Благодаря конкурсам Программы более чем в **15%** проектов были разработаны, апробированы и внедрены в практику новые социальные технологии и услуги, которые необходимо тиражировать и продвигать для закрепления и усиления эффекта полученных результатов, решения социальных задач Красноярского края и развития и укрепления некоммерческого сектора в целом (Приложение 2).



3

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕТОДОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ «ПАРТНЕРСТВО» В 2018 ГОДУ

3.1. Общий подход

Методология мониторинга была основана на принципе триангуляции: «минимум три метода, минимум три группы респондентов».

Примененные методы:

Структурированное интервью; Публичные отчеты; Анкетирование; Кабинетный анализ; Сайт-визит с посещением мероприятия / наблюдением текущей работы по проекту, в том числе и посредством сайта kras-grant.ru.

Задействованы следующие группы респондентов:

Руководители / ключевые сотрудники СО НКО; Партнеры проектов; Эксперты; Представители целевых аудиторий проектов.

Методы, реализованные при проведении мониторинга, разделены на две категории – респондентные и нереспондентные.

3.2. Респондентные методы

При проведении мониторинга были использованы следующие респондентные методы:

Структурированное интервью:

- с руководителями и сотрудниками СО НКО (очные и телефонные)
- с партнерами проекта (очные)
- с благополучателями проекта (очные)
- с экспертами (очные)

Публичные отчеты:

- руководителей/сотрудников СО НКО, принимавших участие в конкурсах и получивших финансовую поддержку в виде



3

гранта (очные).

Анкетирование:

- представителей СО НКО, целевых аудиторий проектов, аудиторий проектов, являющихся получателями услуг по проектам, партнеров.

Сайт-визит с посещением мероприятий по проекту.

Для проведения очных интервью, публичных отчетов и сайт-визитов эксперты выезжали в территории реализации проектов.

Количественные характеристики примененных респондентных методов приведены в Таблице 1.

№	Метод	Респонденты	Количество
1	Структурированные интервью	Руководители и сотрудники СО НКО, победивших в конкурсе	56 интервью
2		Партнеры проекта	16 интервью
3		Эксперты	7 интервью
4	Публичные отчеты	Руководители и сотрудники СО НКО, принимавшие участие в конкурсах Программы	6 публичных мероприятий по защите отчетов по проектам (51 респондент)

5	Анкетирование	Руководители и сотрудники СО НКО, представители целевых аудиторий проектов СО НКО	168 анкет
6	Сайт-визит с посещением мероприятия / наблюдением за текущей деятельностью по проекту	Руководители и сотрудники СО НКО, представители целевых аудиторий проектов СО НКО	32 посещения

Таблица 1

3.3. Нереспондентные методы

При проведении мониторинга были использованы следующие нереспондентные методы:

- Кабинетный анализ конкурсной нормативной, правовой и иной документации (в т.ч. процедуры, документы, решения, соглашения)
- Контент-анализ публичных источников по тематике конкретных проектов СО НКО (материалы региональных и местных СМИ и Интернет-ресурсов, тематических порталов для НКО, официальных сайтов НКО и страниц в сети)
- Мониторинг включенности Грантополучателей в систему самомониторинга посредством сайта kras-grant.ru
- Анализ документации по проектам - программные и финансовые отчеты, в том числе анализ бухгалтерской отчетности.



3

Количественные характеристики нереспондентных примененных методов приведены в Таблице 2.

№	Метод	Источник информации
1	Анализ конкурсной нормативной, правовой и иной документации 56 проектов	Материалы, представленные Грантодателем и Грантополучателем
2	Контент-анализ публичных источников 56 проектов СОНКО (материалы краевых и местных СМИ и Интернет-ресурсов, в том числе тематических порталов для НКО, официальных сайтов НКО), сайт kras-grant.ru	Материалы, размещенные в личных кабинетах Грантополучателей на сайте kras-grant.ru
3	Анализ программной документации и финансовых отчетов, отзывы благополучателей 56 проектов	Материалы, представленные Грантополучателем

Таблица 2



4

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ- ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Процесс мониторинга эффективности реализации социальных проектов в 2018 году был организован в несколько этапов.

На первом этапе в процессе анализа хода реализации проектов посредством изучения информации, размещенной Грантополучателями на сайте Программы kras-grant.ru, было проанализировано 169 проектов – 100% проектов, профинансированных в рамках Программы (Приложение 3).

Эксперты на основании критериев оценивали всю представленную информацию присваивая по каждому из критериев от 0 до 3 баллов с целью формирования рейтинга проектов, отражающего состояние хода реализации социальных проектов.

Эксперты проверяли своевременность и полноту выполнения работ (мероприятий) согласно организационному плану проекта, заполнение Грантополучателем в личном кабинете формы отчета о проведенных мероприятиях проекта, соотношение заявленных и полученных результатов проекта, а также оценивали информационную открытость организаций,



По итогам анализа хода реализации проектов посредством изучения информации, размещенной Грантополучателями на сайте Программы kras-grant.ru экспертами было выявлено, что из 169 проектов:

Приступили к реализации мероприятий проекта и самомониторингу в срок и в соответствии с требованиями договора

74

Приступили к реализации мероприятий проекта, включились в систему самомониторинга, но с нарушениями требований договора в части сроков размещения отчетной информации на сайте kras-grant.ru, а также требований в части полноты и проработанности разделов формы отчета о проведенных мероприятиях проекта

41

Не включились в систему самомониторинга на сайте Программы kras-grant.ru

28

Приступили к реализации мероприятий проекта с нарушением сроков их реализации

26

На основании анализа хода реализации проектов посредством изучения информации, размещенной Грантополучателями на сайте Программы kras-grant.ru эксперты отметили, что **43% некоммерческих организаций**, получивших финансирование на реализацию социального проекта включились в систему самомониторинга посредством сайта Программы в срок и в соответствии с основными требованиями договора. Они своевременно размещают отчетную информацию о проведенных мероприятиях проекта, качество отчетов о проведенных мероприятиях высокое, все разделы отчета проработаны, все необходимые документы, подтверждающие факт проведения мероприятия и достижения результатов проекта к отчету приложены. Кроме того, информацию о реализуемых проектах можно найти в публичном пространстве, воспользовавшись ссылками, размещенными в отчете о проведенном мероприятии. Это позволило экспертам получить исчерпывающую информацию о ходе реализации проекта, о команде проекта, а также принять участие в мероприятиях проекта, информация о которых размещена в публичном пространстве.

Эксперты в своих комментариях отмечают, что уже на этапе мониторинга хода реализации таких проектов посредством сайта Программы можно увидеть инновационные механизмы, используемые некоммерческими организациями в решении проблем, заявленных в проекте, взаимодействие с партнерами проекта, представителями местного сообщества и рекомендуют эти проекты к мониторингу посредством выезда в территории их реализации. По мнению экспертов именно эти проекты являются носителями новых технологий и результаты достигнутые в ходе реализации проектов должны быть использованы в дальнейшем как для решения социальных задач Красноярского края, так и для



укрепления некоммерческого сектора.

25% некоммерческих организаций, получивших финансирование на реализацию социального проекта, включились в систему самомониторинга посредством сайта Программы с нарушением сроков размещения документов, требуемых нормами договора. При этом подход к размещению отчетных документов в большей степени носит формальный характер. Качество отчетов низкое, разделы не заполнены в полном объеме, приложенные документы не отражают суть мероприятия и не подтверждают достижение результатов мероприятия. Информация о проекте в публичном пространстве размещается выборочно, не является исчерпывающей и посетить мероприятия таких проектов не представляется возможным, при этом руководители проектов сами не всегда управляют организационным планом проекта, ссылаясь на то, что реализация проекта — это всего лишь дополнительная неоплачиваемая общественная деятельность.

По итогам мониторинга информации, представленной Грантополучателями на сайте Программы эксперты отмечают, что сохраняется небольшой процент проектов - **17 %**, которые не включаются в систему самомониторинга в соответствии с требованиями договора, а размещают всю необходимую информацию по факту реализации проекта, тем самым нарушают требования договора в части предоставления промежуточной отчетности по проекту.

Для прояснения ситуации и оценки эффективности реализации таких проектов эксперты рекомендуют проводить мониторинговые исследования посредством выезда в территории реализации проектов.

На основании экспертных заключений можно выделить ряд



ключевых проблем, которые по мнению Грантополучателей способствуют такому состоянию дел в части промежуточной отчетности посредством сайта Программы kras-grant.ru

Более **50 %** Грантополучателей основной причиной несвоевременного размещения промежуточной отчетной информации по проекту на сайте считают, то что на этапе планирования и подачи проекта к участию в конкурсах Программы ими были **не учтены все риски**, которые могли возникнуть в ходе реализации проекта и привести к изменению плановых показателей проекта и как следствие, к нарушениям требований и сроков промежуточной отчетности. **К основным рискам они относят:** несвоевременное финансирование по проекту; отказ партнеров проекта от своих обязательств и сотрудничества; «накладка» сроков проведения мероприятий по проекту на городские или районные мероприятия; незаинтересованности представителей целевой группы проекта в мероприятиях проекта.

Отсутствие в некоммерческой организации компетентных специалистов для формирования качественных отчетов, а также времени для размещения отчетов на сайте Программы, стало основной причиной для нарушения требований договора в части промежуточной отчетности **для 30% Грантополучателей**. И решить эту проблему на данном этапе невозможно, так как реализация проекта — это всего лишь дополнительная неоплачиваемая общественная деятельность.

10% Грантополучателей считают предложенные механизмы и сервисы самомониторинга на сайте Программы неудобными в пользовании. Неудобные для заполнения шаблоны, слабое техническое сопровождение, нет напоминаний, нет приложений для телефонов и т.д.

У 10 % Грантополучателей, которые впервые принимали участие в



слабое техническое сопровождение, нет напоминаний, нет приложений для телефонов и т.д.

У 10 % Грантополучателей, которые впервые принимали участие в конкурсах отсутствует в полном объеме информация о технологии самомониторинга посредством сайта Программы.

Также эксперты дополнительно в своих комментариях обращают внимание на то, что низкое качество отчетов обусловлено не только выше упомянутыми проблемами, но и тем что многие проектные команды, особенно из отдаленных районов и малых сел используют для подачи заявки на конкурс общественные организации, которые не имеют отношения к дальнейшей реализации проекта и не готовы его полностью сопровождать, в том числе и в рамках самомониторинга. А проектная команда, так как не является заявителем иногда не обладает в полной мере информацией в части отчетности по проекту.

По итогам проведения мониторинга проектов посредством сайта Программы эксперты отмечают, что он дает неполное представление о качественных и количественных результатах реализации проектов и промежуточная экспертиза становится отправной точкой для прояснения ситуации в территориях и основанием для формирования списка проектов, которые могут стать площадкой для проведения мониторинговых исследований в территориях реализации проектов.

Для проведения **второго этапа мониторинга**, посредством выезда экспертов в территории реализации проектов на основании составленного рейтинга и рекомендаций экспертов было выбрано **56 проектов** (Приложение 4). **Это 35% от общего количества социальных проектов, получивших грантовую поддержку.**

56 проектов

7

Проекты, получившие наивысший балл по итогам мониторинга посредством сайта

12

Проекты с особым мнением и рекомендациями экспертов, Совета по краевым социальным грантам (не все мероприятия организационного плана отражены в отчетах, но качество отчетов, выставленных на сайт очень высокое, в отчетах отмечены новые формы взаимодействия с партнерами, структурами власти и т.д.)

37

Проекты, получившие наименьший балл по итогам мониторинга посредством сайта



Также при определении перечня проектов для мониторинга посредством выезда учитывалась представленность групп районов края и охват номинаций конкурсов Программы (Приложение 5).

Мониторинг эффективности реализации социальных проектов в территориях края, посредством выезда в территории их реализации был проведен **в восьми территориальных группах Красноярского края, которые охватили 20 населенных пунктов.**

Для организации мониторинга на данном этапе было привлечено 7 экспертов. При осуществлении мониторинга эксперт, находясь на территории реализации проекта, на основании критериев, оценивал достижение основных результатов проекта и его эффективность реализации в целом. Каждому критерию присваивается от **0 до 4 баллов**. По каждому критерию эксперт давал оценку и содержательный итоговый комментарий.

По выбранным **56 проектам** было запланировано заочное анкетирование руководителей некоммерческих организаций, очные публичные отчеты о достигнутых результатах в рамках реализованных проектов и интервью в местах выезда экспертов. По целевой аудитории этих же проектов (на основании списков благополучателей) были распространены анкеты для благополучателей и партнеров. Однако, в силу объективных обстоятельств, представители некоторых организаций не смогли непосредственно принять участие в очных отчетах и интервью, в связи с чем часть из них проведена по телефону. По некоторым проектам в списках благополучателей не оказалось контактов, хотя на информационных семинарах для Грантополучателей было рекомендовано вести списки благополучателей с контактами и с обязательным получением от благополучателей разрешения на использование персональных данных.

Таким образом, была проведена работа по сбору данных от респондентов. Респондентами настоящей оценки стали исполнители 56 проектов-победителей, которые в момент сбора данных были доступны и более 100 благополучателей, а также партнеры, которые откликнулись на приглашение к участию в оценке.

Дистанционно из Красноярска был проведен анализ конкурсной нормативной, правовой и иной документации, публичных источников по тематике конкретных проектов СОНКО (материалы краевых и местных СМИ и интернет-ресурсов, в том числе тематических порталов для НКО, официальных сайтов НКО), программных и финансовых отчеты, отзывов благополучателей.




5

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ ПОСРЕДСТВОМ ВЫЕЗДА В ТЕРРИТОРИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Результаты мониторинга по критерию «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта»

В рамках этого критерия эксперты оценивали достижение по факту реализации проекта таких плановых показателей как сроки реализации проекта, количественный охват целевой группы проекта, количество мероприятий проекта, количество партнеров проекта, достижение результатов по проекту.

Результаты мониторинга по показателю «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части сроков реализации проектов».

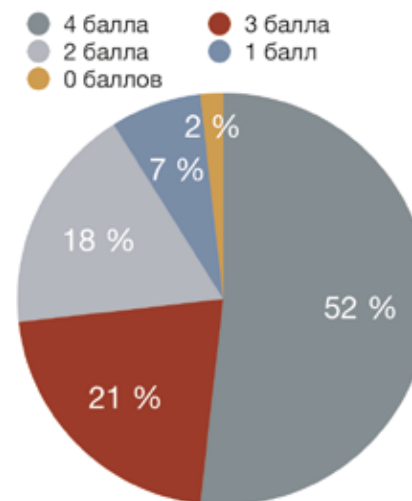

Показатель 1.1 Сроки реализации проекта



По результатам мониторинга из диаграммы видно, что **52%** проектов набрали наивысшее количество баллов по критерию «Соответствие плановых сроков реализации проекта фактическим» в части сроков реализации проекта. В рамках реализации этих проектов заявленные мероприятия реализованы в сроки, указанные в организационном плане проекта. Своевременная реализация мероприятий проекта подтверждена соответствующими отчетными документами как в ходе промежуточного отчета на сайте Программы, так и в ходе выездного мониторинга в формате публичной отчетности руководителей некоммерческих организаций и индивидуального общения с экспертами. **21%** проектов по данному критерию набрали 3 балла. Плановые показатели в части своевременности реализации мероприятий проекта достигнуты на **80 %** с небольшими изменениями графика реализации мероприятий. Все изменения в графике реализации мероприятий в этих проектах согласованы с Грантополучателем с пояснением причин отклонения и закреплены дополнительными соглашениями к договору о краевом социальном гранте. Эксперты отмечают, что изменение графика реализации мероприятий в вышеуказанных проектах было вызвано объективными обстоятельствами и не значительно повлияло на качество их реализации. По факту реализации проектов были достигнуты все запланированные результаты.

В ходе мониторинга эксперты отметили **18%** проектов, которые были реализованы со значительным нарушением плановых сроков реализации мероприятий проекта. Все изменения в части сроков были согласованы с Грантодателем, но по факту повлияли на качество реализации проектов. Не все запланированные мероприятия в рамках этих проектов удалось провести, а в некоторых из них не удалось охватить плановое количество

представителей целевой группы проекта. Из диаграммы видно, что **7%** проектов набрали по итогам мониторинга всего 1 балл. Это проекты, в которых фактические сроки реализации мероприятий всего на **30%** соответствуют плановым. При этом причины изменения сроков реализации мероприятий не обоснованы, не согласованы с Грантодателем и не закреплены дополнительным соглашением. Эксперты отмечают, что выявить наличие отклонений от графика и плановых показателей, а также их причины удалось лишь частично, в ходе непосредственного общения с членами проектной группы в рамках выездного мониторинга. Среди причин, оказавших влияние на изменения графиков проектов, Грантополучателями были отмечены следующие:

- несвоевременное заключение договора и как следствие задержка финансирования по проекту
- отсутствие в проекте запланированных механизмов вовлечения и мотивации представителей целевой группы в мероприятия проекта и как следствие недобор представителей целевой аудитории проекта на мероприятия, особенно в летний период
- неучтенные риски и не запланированные способы, и ресурсы для работы с ними в ходе реализации проекта (погодно-климатические факторы, отказ партнеров от сотрудничества, загруженность членов проектной команды по профессиональной деятельности и др.)
- низкая осведомленность членов проектной команды об обязанностях в рамках заключенного договора о краевом социальном гранте (не читают положение о конкурсе, договор, инструкции и рекомендации, не взаимодействуют




с ресурсными центрами и координаторами)

- нехватка времени и «рук» у членов проектной команды

Также эксперты отмечают, что в ходе мониторинга им удалось не в полной мере оценить соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации проектов, опросить представителей целевой группы и партнёров проекта, а также визуально осмотреть материальную базу тех проектов, руководители которых не принимали участие в публичных отчетах и не предоставили соответствующие документы. Это такие проекты как:

1. Проект «Игра в Жизнь», Красноярская региональная общественная организация поддержки многодетных семей «Новый день»
2. Проект «Оказание паллиативной помощи на дому», Автономная некоммерческая организация Железногорский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых»

5.2. Результаты мониторинга по показателю «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части количества мероприятий проекта

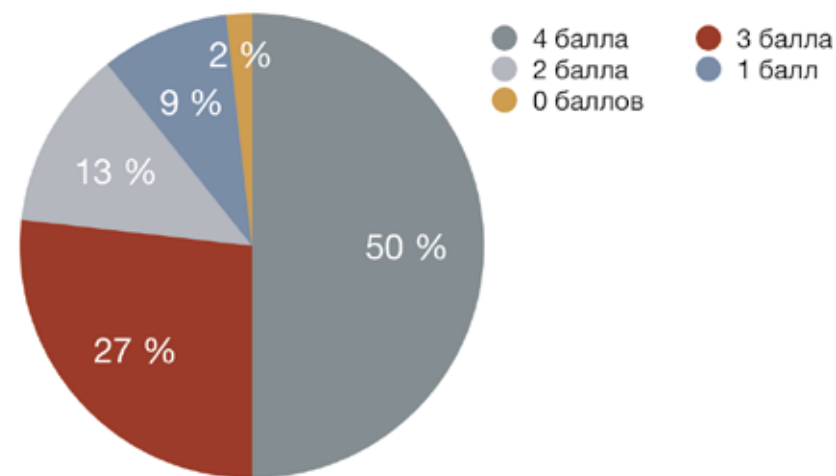

Показатель 1.2 Количество мероприятий


Из диаграммы видно, что **50%** проектов набрали наивысшее количество баллов по критерию «Соответствие плановых сроков реализации проекта фактическим» в части количества мероприятий по проекту. В рамках реализации этих проектов заявленные мероприятия реализованы своевременно и в полном объеме. По мнению экспертов, реализация запланированных мероприятий в рамках проектов в срок и в полном объеме говорит о том, что заявители стали более ответственно подходить к выбору механизма решения заявленной в проекте проблемы, а также к планированию деятельности по проекту на этапе



формулирования проектной идеи и подачи проекта на конкурс. Эксперты отмечают, что заметно выросла исполнительская дисциплина Грантополучателей в ходе реализации проектов. У **27%** проектов в ходе реализации их проектов произошла незначительная корректировка организационных планов в части перечня запланированных мероприятий. У **24** проектов по итогам мониторинга экспертами выявлено значительное отклонение как в части своевременности, так и в части объема запланированных мероприятий проекта. При этом корректировка мероприятий или отказ от их проведения не всегда своевременно согласован с Грантодателем.



5.3. Результаты мониторинга по показателю «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части количества представителей целевой группы.

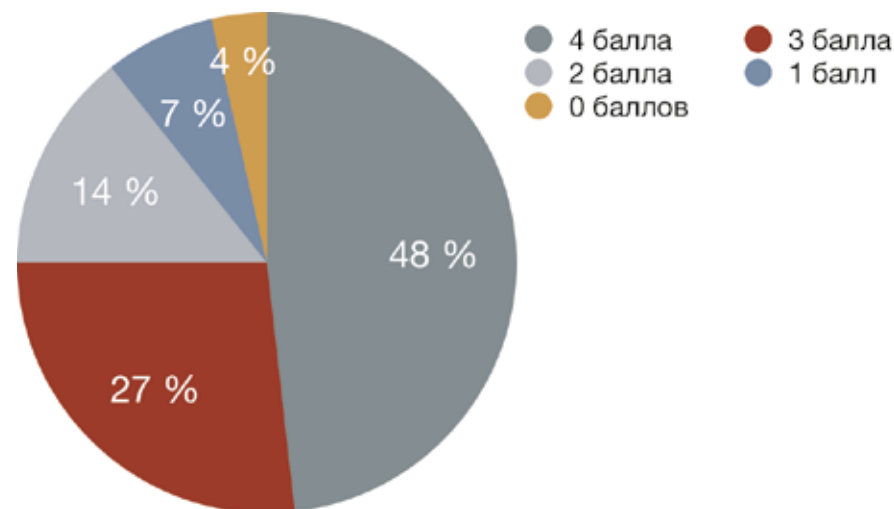

Показатель 1.4 Количество целевой группы

В ходе мониторинга эксперты оценивали проекты по критерию «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части количественного охвата представителей целевой группы. Больше, чем в **48%** проектов фактический показатель по количеству вовлеченных в проект представителей целевой группы проекта соответствует плановому. В ходе реализации этих проектов проектной команде удалось не только вовлечь, но и сохранить запланированное количество представителей целевой группы.



Эксперты отмечают, что в первую очередь это связано с тем, что уже на этапе планирования мероприятий проекта исполнители предусмотрели механизмы вовлечения и мотивации представителей целевой группы в мероприятия проекта, а в отдельных случаях на этапе планирования проектной идеи провели анализ потребностей целевой группы и их готовности включиться в мероприятия проекта. В тех проектах, в которых эти меры были не предусмотрены, произошло значительное сокращение представителей целевой группы в ходе реализации проекта.


Также сокращение количества представителей целевой группы в **27%** проектов связано с тем, что изначально проектной командой были выбраны не актуальные или не востребованные целевой группой проекта механизмы и методы работы. Например, в проекте «Почти как иностранцы в России...», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья «Легкий шаг» в городе Ачинск проектной командой на старте проекта была предложена серия мероприятий направленных на развитие творческих способностей и расширение коммуникативных возможностей людей с нарушениями слуха через проведение индивидуальных занятий и цикла занятий в инклюзивной группе по развитию актерского мастерства и пантомимы. В ходе реализации проекта проектная команда выявила, что применение традиционных технологий обучения театральному мастерству не эффективно в работе с людьми с нарушениями слуха. У целевой группы проекта возникали непреодолимые трудности в осмыслении текстов, заучивании ролей, что поставило под угрозу постановку итогового спектакля в проекте, а также заинтересованность представителей целевой группы к дальнейшему участию в проекте. Психологом, принимавшим участие в проекте, была предложена для работы технология невербального театра в работе с людьми с

ограниченными возможностями -«**Open Theater Company Ltd**». На практических занятиях, организованных по данной методике, участники проявили заинтересованность и активно включились в творческий процесс подготовки итогового спектакля.

Безусловно, социальный проект — это эксперимент, проба, «живой организм», который требует управления на всех его жизненных циклах. Спланировать, рассчитать, предусмотреть все на **100%** на этапе планирования не всегда возможно. Изменение сроков, количества и качества участников проекта, подходов и методов, ресурсов в проекте по ходу его реализации это неизбежная реальность. Управление этими изменениями - ключевая задача проектной команды на этапе реализации проекта, где основной целью должно стать сохранение изначально запланированного качества проекта.



5.4. Результаты мониторинга по показателю «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части количества партнеров проекта.

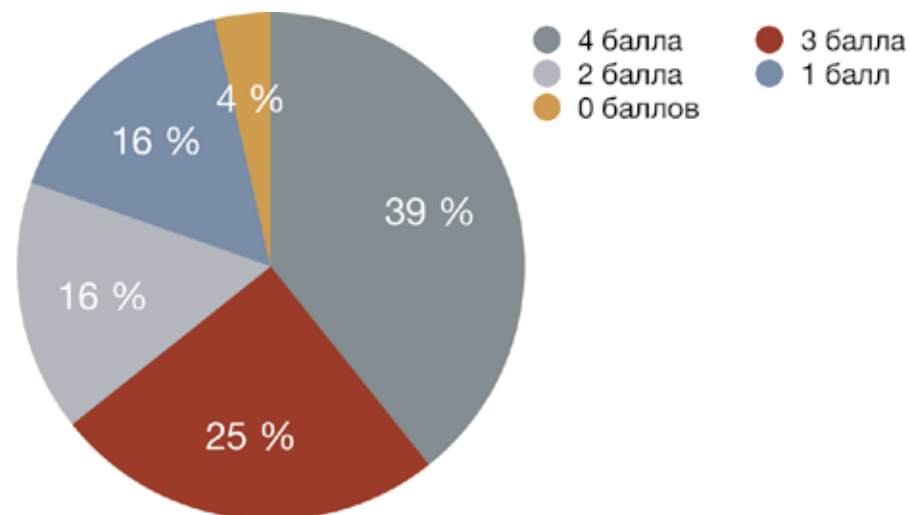

Показатель 1.5 Количество партнеров проекта

Фактические показатели по количеству привлечённых партнеров соответствуют плановым у **39%** проектов, повергшихся мониторингу. Отчетные документы, представленные руководителями организаций в ходе публичных отчетов, подтверждают сохранение не только количественного состава партнеров проектов, но и использование заявленных ресурсов партнеров в ходе реализации проекта. Кроме этого, как отмечают эксперты в большей части проектов, партнеры не просто оказывали материальную поддержку, а были активно вовлечены реализацию

мероприятий проектов. Также эксперты отмечают, что в отдаленных территориях края партнерами проектов преимущественно остаются органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, которые активно включаются в реализацию проектов, так как максимально заинтересованы в привлечении дополнительного финансирования для решения проблем местного значения.

Кроме этого интервью с СО НКО продемонстрировали зарождение тенденции к объединению в коалиции. Более **10 %** СО НКО в ходе реализации проектов установили новые партнерские отношения с теми СО НКО края, которые занимаются решением близких социальных проблем. Коалиционная стратегия может способствовать развитию устойчивости некоммерческих организаций, особенно в малых территориях, а также доступности услуг, оказываемых СОНКО.

В **16%** проектов произошли незначительные отклонения по данному показателю. При сокращении количества партнеров проектной команде удалось сохранить и объём мероприятий, и качество их проведения. Грантополучатели отмечают, что отказ от сотрудничества в ходе реализации проекта в основном происходил по объективным причинам, таким как «накладка» мероприятий, погодные условия, поломка транспортного средства и т.д. Все проблемы, возникшие в результате вышеуказанных причин, удалось решить благодаря внутренним ресурсам организации и поддержке местной власти.


В **20%** проектах фактические показатели по количеству партнёров проекта не соответствуют плановым. Грантополучатели отмечают, что в большей части это прогнозируемая ситуация, так как их участие в проекте носило формальный характер, обусловленный требованиями конкурса Программы. Письма поддержки,



предоставленные на этапе подачи проектной заявки на конкурс не отражали суть сотрудничества и вид обязательств, которые готовы были взять на себя партнёры.



5.5. Результаты мониторинга по показателю «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части запланированных результатов проекта

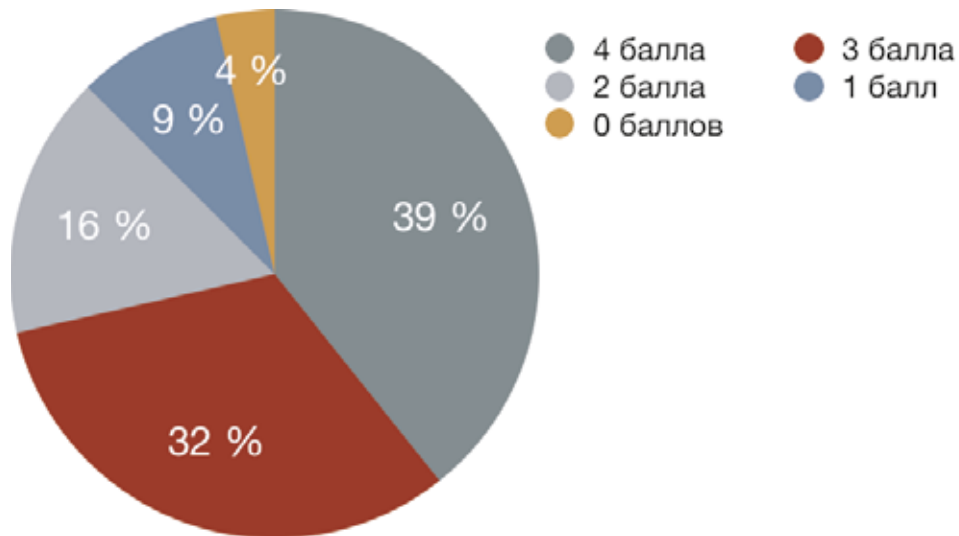

Показатель 1.7 Запланированные результаты проекта

Мониторинг эффективности реализации социальных проектов получивших грантовую поддержку в 2018 году проводился в октябре-ноябре 2018 года. В этот период еще не все некоммерческие организации завершили работы по проектам. В связи с этим эксперты оценивали соответствие фактически достигнутых результатов плановым на дату проведения мониторинга. По результатам оценки экспертов **39%** проектов достигли планируемых результатов проекта. В ходе публичных отчетов и индивидуального общения с экспертами руководители проектов подтвердили достижение результатов отчетными документами. Также эксперты выезжали на места реализации проектов и общались с участниками проектов. В своих заключениях эксперты отмечают, что в этом году качество отчетных первичных документов гораздо выше, чем в предыдущие годы, к итоговой отчетности большая часть некоммерческих организаций начинает готовиться заранее, архивируя документы, а не по факту завершения проекта. При презентации достигнутых результатов Грантополучатели отмечали, что по факту завершения проектов были достигнуты дополнительные, незапланированные результаты, которые повлияли на планы по дальнейшему развитию проекта.

Из диаграммы видно, что **32%** проектов, на момент проведения мониторинга достигли результаты не в полном объеме по отношению к плановым. Грантополучатели отмечали, что не все удалось сделать в ходе проекта. Например, в связи с сокращением количества представителей целевой группы проектов пришлось отказаться от части мероприятий, запланированных ранее. Особенно это касалось проектов, у которых мероприятия по проекту были запланированы на летний период или проектов, которые не учли в полной мере специфику целевой аудитории. Также пришлось отказываться от проведения части мероприятий




или корректировать плановые с учетом возникших ограничений по ресурсам тем проектам, в которых партнеры не выполнили свои обязательства. Несвоевременное заключение договоров и как следствие задержка финансирования по проектам по мнению Грантополучателей также повлияло на выполнение работ по проектам и достижение заявленных результатов. Все отклонения и изменения плановых показателей в части результатов в ходе реализации проектов этой группы были обоснованы, согласованы с Грантодателем и закреплены дополнительными соглашениями.

В **29%** проектов результаты достигнуты лишь на **50%** по отношению к плановым. Причины, по которым Грантополучателям не удалось достигнуть результатов по проекту не обоснованы и не доведены до Грантодателя. Лишь посредством выездного мониторинга экспертам в процессе общения и анализа имеющихся документов удалось выяснить, что Грантополучатели этой категории проектов не располагали информацией о том, что обязаны вести промежуточную отчетность на сайте Программы, а также информировать Грантодателя об изменениях в ходе реализации проекта. Экспертами были даны рекомендации по подготовке аналитических и финансовых отчетных документов в сложившейся ситуации.

По итогам оценки проектов по показателю «Соответствие плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части запланированных результатов проекта эксперты отметили в целом, что для значительной части проектов характерна нечеткость либо некорректность формулировки показателя результативности и его количественного выражения, ориентированного на конкретные и измеримые ожидаемые результаты деятельности. Также в проектах отсутствует входной анализ, который бы позволял оценить динамику изменения

показателей в ходе реализации проектов и сделать объективный вывод о достижении запланированных результатов по проектам.

5.6. Результаты мониторинга по критерию «Социальная эффективность проекта по факту его реализации»

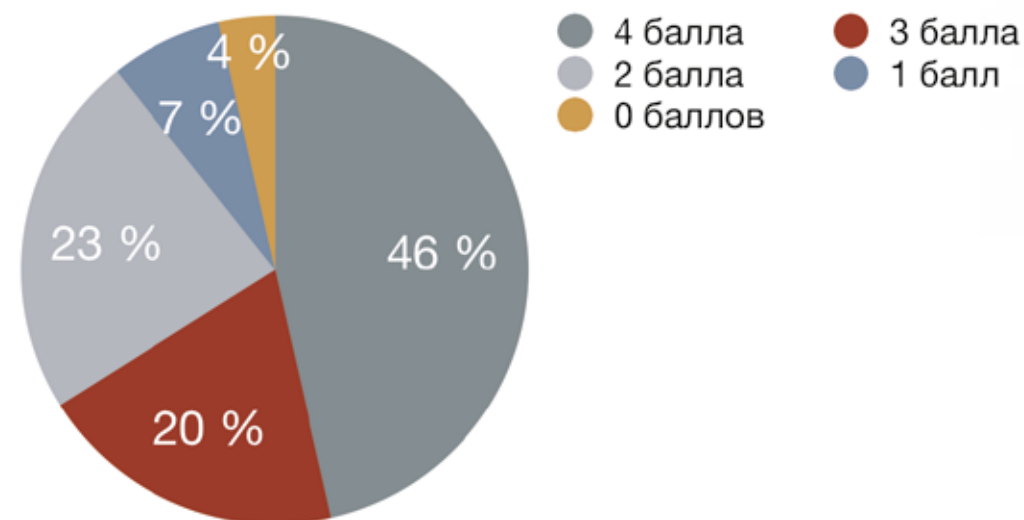

Критерий 2. Социальная эффективность проекта по факту его реализации



В рамках критерия «Социальная эффективность проекта по факту его реализации» эксперты оценивали актуальность и востребованность оказанных услуг, проведенных мероприятий для целевой группы проектов и влияние проекта на решение социальных проблем, которые были заявлены в проектах. Для оценки социальной эффективности проектов по факту из реализации в ходе публичных отчетов, интервью и опросов эксперты изучали мнения как представителей целевых групп проектов, так и мнение представителей некоммерческих организаций, реализовавших социальные проекты в территориях Красноярского края.

На основе анализа полученной информации эксперты делают выводы, что в **46%** проектов социальная эффективность по факту реализации проекта достигнута.

Эксперты отмечают, что в ходе реализации проектов этой категории сохранены не только количественные показатели в отношении целевой группы, но и достигнуты качественные показатели, благодаря которым появилась положительная динамика в решении заявленных в проектах проблемах целевых групп. С точки зрения **90%** опрошенных руководителей некоммерческих организаций актуальность и востребованность оказанных услуг и проведенных мероприятий проектов для целевой аудитории была высокой. По мнению самих благополучателей, большинство оказанных по проектам услуг и проведенных мероприятий были эксклюзивными, то есть более 80% опрошенных благополучателей отметили, что не могли бы получить эти услуги в ином месте и проекты предоставили им уникальную возможность.

Из диаграммы видно, что **30%** проектов набрали невысокий балл по показателю «Социальная эффективность проекта по факту его реализации». В первую очередь это проекты, в которых произошли

изменения по таким плановым показателям, как количественный состав представителей целевых групп, своевременность и объем мероприятий. Эксперты в своих комментариях делают выводы, что в первую очередь это обусловлено отсутствием детального анализа на этапе формулирования проблемы проекта, анализа потребностей, запросов, стиля жизни целевой аудитории, выявления «своего» потребителя, который в перспективе будет вовлечен в проект и станет основным потребителем услуги или участником мероприятий проекта. В связи с этим эффективность дальнейшего взаимодействия с целевой группой проекта снижается. Недостаточно красиво написать проектную заявку с соблюдением всех формальных критериев, необходимо, уже на этапе планирования продемонстрировать благополучателю какие его проблемы в перспективе решит предлагаемый проект и как он изменит по факту реализации его качество жизни.


Кроме этого, эксперты выделяют проекты, которые были поданы к участию в конкурсе некоммерческими организациями, но исполнителями по факту являлись бюджетные учреждения (библиотеки, молодежные центры дома культуры). Предложенные мероприятия и услуги в рамках таких проектов мало чем отличались от текущей деятельности этих учреждений. В связи с этим благополучатели на вопрос о положительной динамике и улучшении качества жизни благодаря реализации этих социальных проектов ответили «не знаю», так как не увидели разницы между услугами учреждений и услугами и мероприятиями, предложенными в рамках реализуемых проектов.

В целом же, руководители СО НКО, которым удалось по факту реализации проекта достичь высокой социальной эффективности отмечают, что использование полученных результатов в ходе реализации проектов (приобретенное оборудование,



отремонтированные помещения, созданная инфраструктура и т.д.) позволит в перспективе расширить возможности некоммерческих организации для дальнейшей работы по реализованным проекту. Многие СО НКО благодаря реализации проектов расширили круг людей из целевой аудитории, которые получили доступ к услугам – более **50 %** респондентов из СО НКО ответили «да» на вопрос о новой целевой группе. Более **10 %** респондентов из СО НКО планируют в перспективе выведение апробированных в ходе реализации проектов услуг на аутсорсинг, а также получение государственного заказа на услуги СО НКО.

5.7. Результаты мониторинга по критерию «Ресурсная эффективность проекта по факту его реализации»

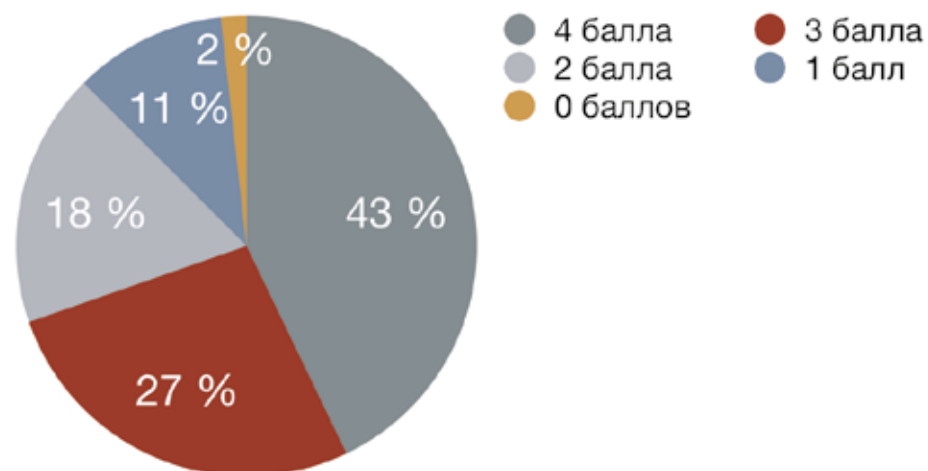

Критерий 3. Ресурсная эффективность проекта по факту его реализации

Ресурсная или ресурсно-организационная эффективность выражается в динамике развития СО НКО. Она характеризуется изменениями в потенциале СО НКО: кадровом, технологическом, управленческом, финансовом и показывает изменения устойчивости организаций и сектора в целом. В данном случае бенефициарами деятельности являются не граждане, а сами СО НКО, исполнявшие проекты, либо другие СО НКО, получавшие услуги по проектам.

Показатели, отражающие изменения ресурсной эффективности, должны замеряться в динамике по состоянию на начало реализации



проекта и после реализации. В настоящей оценке были определены только показатели на конец реализации проектов, но при последующем мониторинге можно будет учесть настоящие данные.

Из диаграммы видно, что **43%** проектов, подвергшихся мониторингу посредством выезда, ресурсный потенциал СО НКО достаточно силен и укрепляется за счет приобретения дополнительного опыта и партнерских связей в процессе реализации проектов. Опыт работы по проектам, в том числе опыт разработки и внедрения новых социальных технологий, позволил сотрудникам СО НКО повысить свой профессиональный уровень и усилил кадровый потенциал СО НКО. В ходе реализации проектов удалось сохранить количественный и качественный состав проектных команд, партнеров. Руководители СО НКО, отмечают, что кроме сотрудников, в работу по проектам были привлечены добровольцы. Среди добровольцев были как молодые люди, выполнявшие не квалифицированную, но социально значимую работу, так и профессионалы, которые выделяли часть своего времени на безвозмездный труд.

В ряде проектов эксперты советовали СО НКО для дальнейшего развития объединить свои усилия. По некоторым проектам, сами СО НКО отметили, что у них налажено взаимодействие с коллегами из других организаций. Так же СО НКО отметили, что знают, что есть общие моменты во многих проектах и было бы хорошо по окончании проектов провести общее мероприятие для обмена опытом, идеями, и для предоставления людям возможности найти единомышленников и объединиться для выполнения новых проектов.

Более чем в **27%** проектов ресурсная эффективность по факту реализации проекта выражена слабо. В первую очередь представители организаций этой категории отмечают, что это


связано с недостаточным кадровым обеспечением организаций. В организации нет постоянного штата сотрудников, часто проект замкнут на одном человеке лидере или руководителе, в связи с чем команда проекта действует недостаточно эффективно, что приводит к отклонениям от исполнения плановых показателей, а социальные эффекты проекта носят локальный характер. Нехватка кадров в организации отчасти восполняется за счет добровольцев, но при отсутствии качественного менеджмента в работе с добровольцами организациям не удастся вовлечь их в системное сотрудничество. Также эксперты отмечают, что несформированность инфраструктуры для осуществления деятельности СО НКО, в том числе, отсутствие помещений, слабая материально-техническая база ограничивают ресурсную эффективность некоммерческих организаций в целом.

В ходе мониторинга эксперты выделяют категорию проектов, которые реализуются проектными группами при поддержке бюджетных учреждений. Это касается случаев, когда заявителем по проекту является некоммерческая организация, а исполнителем проектная группа, члены которой не имеют никакого отношения к организации - заявителю. Данная схема сотрудничества в большей степени способствует развитию деятельности и материально-технической базы бюджетных учреждений, а не ресурсному потенциалу некоммерческих организаций.



5.8. Результаты мониторинга по критерию «Информационная эффективность проекта по факту его реализации»

В ходе мониторинга проектов по критерию «Информационная эффективность проекта по факту его реализации» эксперты оценивали включенность организации в процесс самомониторинга на сайте государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство», количество информационных материалов о мероприятиях проектов, размещённых в публичном пространстве, количество отзывов благополучателей о проекте, узнаваемость проекта в территории его реализации.

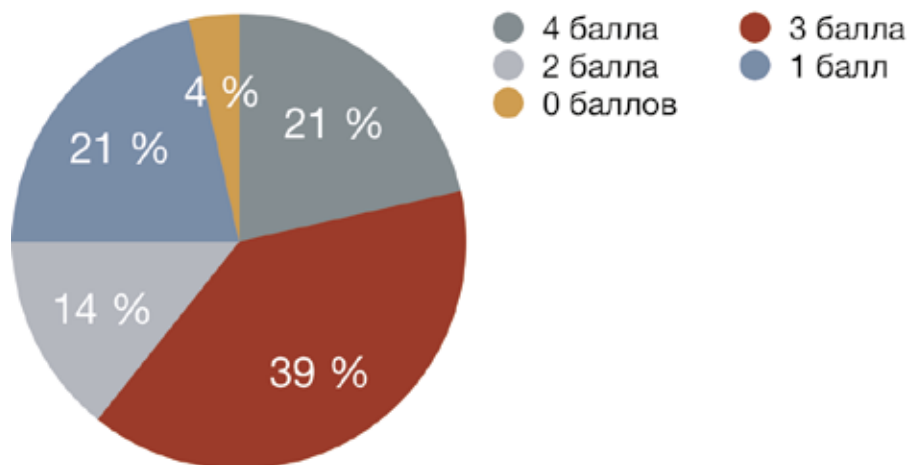

Критерий 4. Информационная эффективность проекта по факту его реализации

Прозрачность и открытость СОНКО и ее деятельности в рамках реализации социальных проектов, поддержанных государственной грантовой программой Красноярского края «Партнерство» – один

из важнейших критериев оценки проектной заявки, подаваемой на конкурс Программы. В связи с этим организация, которая получила грантовые средства на реализацию проекта в ходе его реализации должна обеспечить актуальное и системное информационное сопровождение мероприятий проекта. Но при этом, из диаграммы видно, что только **21%** проектов от общего количества, подвергшихся мониторингу, системно размещали информацию о ходе реализации проектов в публичном пространстве, в том числе упоминали тот факт, что проект реализуется при поддержке государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство». Также эти организации активно включились в систему самомониторинга на сайте Программы kras-grant.ru, своевременно размещали информацию о плановых мероприятиях проекта, отчеты о проведенных мероприятиях и документы, подтверждающие достижение промежуточных результатов проекта. В ходе мониторинга информации на сайте Программы эксперты отмечали, что у проектов данной категории информация о ходе реализации проектов присутствует не только в личном кабинете на сайте программы, но и активно размещается в сети Интернет, социальных сетях. У **39%** организаций есть сайты организаций, либо страницы на сайтах организаций партнёров, на которых размещена актуальная информация как об организации, так и о реализуемом проекте. Информация открыта, актуальна и размещается заблаговременно до проведения мероприятий и после. Это позволило экспертам в ходе мониторинга посетить мероприятия, пообщаться с партнерами проекта и благополучателями.

В ходе мониторинга экспертами была выделена группа проектов, которые нарушали сроки размещения информации о ходе реализации проекта, но отчетные и подтверждающие документы были высокого качества, отражали специфику мероприятий. Данные проекты были рекомендованы экспертами к мониторингу посредством выезда в территорию реализации проекта.



Более **25 %** проектов по оценке экспертов включились в систему самомониторинга несвоевременно и отнесли к этому процессу формально. Отчеты о проведенных мероприятиях не всегда отражали специфику мероприятий и достижение промежуточных результатов по проекту. В результате контент-анализа материалов краевых и местных СМИ, интернет-ресурсов, в том числе официальных сайтов и страниц некоммерческих организаций эксперты сделали вывод, что по проектам данной группы информация в публичном пространстве размещалась выборочно и не системно. В ходе публичных отчетов руководители этих организаций отмечали, что предпочитают в ходе реализации проекта работать со «своей» целевой аудиторией в прямую, передавая информацию из «рук в руки» от исполнителей проекта. Данный подход, считают руководители, позволяет адресно и оперативно взаимодействовать с целевой группой проекта. Однако, экспертами была отмечена ситуация, что при общении с участниками проектов, с которыми они встречались в ходе мониторинга многие не могли ответить на прямой вопрос, в рамках какой Программы реализуется проект, в котором они участвуют. Кроме того, эксперты отмечают, что при таком подходе некоммерческих организаций к распространению информации представители целевой аудитории знают лишь об отдельных мероприятиях проекта и не всегда имеют представление о социальном проекте, который направлен на решение социально-значимой проблемы и реализуется в территории. Также эксперты отмечают, что при работе с информационными источниками многие организации забывают включать в информационные продукты пункт о причастности проекта к краевой государственной грантовой программе «Партнерство» несмотря на то, что в договоре есть пункт, обязывающий грантополучателей отмечать этот факт. В целом эксперты отмечают, что преобладающим источником информации о мероприятиях проектов остается интернет и социальные сети. Часть информации по проектам размещены, в частности, в сетевых

сообществах «Вконтакте» и «Facebook». В отдаленных территориях края, для распространения информации о проекте используются административные каналы. В сельских территориях этот канал задействован чаще, чем в крупных городах. В тех муниципальных образованиях, где активно работают муниципальные ресурсные центры или координаторы грантовой программы, использование этих каналов становится более эффективным. Распространение информации в СМИ остается актуальной лишь для крупных проектов, поддержанных Программой, в которых изначально были заложены средства для использования этого проектного инструмента. Рекламная и раздаточная продукция тоже используется организациями для распространения информации по проектам. Как способ информирования, привлечения целевой аудитории или партнеров он подходит далеко не для всех проектов, кроме того он связан с определенными креативными, техническими и денежными затратами на создание такой продукции, и потому многие организации не включают его в набор своих проектных инструментов. Достаточно серьезную роль в повышении активности грантополучателей в плане анонсирования мероприятий сыграла работа Краевого центра поддержки общественных инициатив и муниципальных ресурсных центров, направленная в первую очередь в формате семинаров, мастер-классов на разъяснение основных требований в части информационной открытости некоммерческих организаций, получивших поддержку в рамках грантовой программы. Кроме этого, велась активная работа по сопровождению организаций в части составления анонсных и итоговых пресс-релизов о мероприятиях проектов, распространения информации о ключевых событиях мероприятий проектов в краевых СМИ.



6

ОЦЕНКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОВЛИЯВШИХ НА КАЧЕСТВЕННУЮ/ НЕКАЧЕСТВЕННУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ

Полученные данные в ходе мониторинга эффективности реализации социальных проектов, получивших финансовую поддержку в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство», позволяют выделить ряд факторов, негативно влияющих на реализацию как отдельно взятого социального проекта, так и Программы в целом:

6.1. Дефицит целеполагания в ходе планирования деятельности. Под дефицитом целеполагания понимается проблема эффективной постановки целей и задач в рамках реализуемых некоммерческими организациями социальных проектов, а также проблема верного определения методов решения поставленных задач. При разработке своих проектов организации ставят целью удовлетворение той или иной потребности своих целевых групп. Однако далеко не всегда можно понять, действительно ли заявленная потребность имеет место быть и насколько она актуальна для целевой группы проекта.

6.2. Деятельность некоммерческих организаций в рамках социальных проектов в основном направлена на осуществление вспомоществования целевым группам и пропаганды ценностей среди них, и в меньшей степени – на решение существующих социальных проблем, на создание механизмов повышения качества их жизни. Эффективность пропаганды ценностей среди целевых групп, осуществляемая НКО обычно в виде мероприятий, слабо поддается оценке и практически не имеет обратной связи.

6.3. Отсутствие ориентированности на результат в ходе реализации проектов, что приводит к нерациональному расходу ресурсов, а главным критерием успешности той или иной некоммерческой организации является количество проведенных мероприятий и количество принявших в них участие людей. Именно эта проблема ограничивает развитие спектра и качества проектов, подаваемых на конкурсы Программы.

6.4. Отсутствие в проектной деятельности большей части некоммерческих организаций необходимой системности – зачастую тот или иной проект создается без связи с проектами



других некоммерческих организаций, в отсутствии планирования его дальнейшего развития и способов закрепления эффективности, а также без предварительной оценки действительной полезности этого проекта для выбранной целевой группы проекта.

6.5. Дефицит среди большинства руководителей и сотрудников некоммерческих организаций таких управленческих навыков, как: рефлексия; ориентированность на результат; системное планирование деятельности; поиск нескольких решений одной задачи. Это приводит к тому, что многие НКО начинают работать по принципу «проекты ради проектов», при этом главным становятся количественные показатели (количество проектов, количество охваченных проектами людей и т.д.) взамен качественных.

6.6. Дефицит компетенций в плане непосредственной работы с людьми, представителями целевых аудиторий проектов, что ограничивает активное участие представителей местных сообществ в реализации проектов.

6.7. Слабость горизонтальной кооперации, под которой подразумевается совместная реализация социальных проектов. Это связано с тем, что каждая НКО стремится занять свою нишу в рамках конкретной территории (край, город, район) и конкретного вида деятельности. Некоммерческие организации готовы обмениваться опытом, но в практическом поле де-факто конкурируют друг с другом за ресурсы.

Вместе с тем, выделим значимые факторы, влияющие на получение высоких результатов в ходе реализации проектов:

6.8. Появление таких некоммерческих организаций, которые в рамках социальных проектов направляют свою деятельность на решение конкретных существующих социальных проблем, в том числе на создание механизмов повышения качества жизни целевой аудитории проектов.

6.9. Развитие социальной коммуникации внутри местных сообществ. В своей деятельности некоммерческие организации все больше опираются на гражданскую активность, используют неформальные гражданские сети и ресурс местной благотворительности, добровольчества.

6.10. Развитие устойчивости некоммерческих организаций. Способность привлекать средства для осуществления своей деятельности из различных видов источников (не только грантовые средства)

6.11. Появление у некоммерческих организаций долгосрочных проектов, программ и услуг в социальной сфере, которые имеют наибольшую эффективность в решении социальных проблем по сравнению с краткосрочными проектами.

6.12. Появление у НКО социальной и экономической мотивации к объединению и построению горизонтальной кооперации в части решения социальных проблем.

6.13. Наличие филиалов организаций в территориях края.

6.14. Узнаваемость и брендируемость некоторых некоммерческих организаций в крае



6

6.15. Открытость и прозрачность некоммерческих организаций, наличие собственных информационных источников и актуальных и обновляемых информационных продуктов.

6.16. Наличие четкой, прозрачной и системной региональной политики в отношении социально ориентированных некоммерческих организаций.



7

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Полученные в ходе мониторинга данные позволяют сделать вывод о том, что общественная активность некоммерческих организаций в территориях Красноярского края постоянно растет, увеличивается количество и качество поданных проектных заявок на участие в конкурсах государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство», а также количество поддержанных Программой социальных проектов. Как уже было отмечено выше, реализация социальных проектов в территориях края заметно влияет на повышение активности населения. Руководители организаций в беседе с экспертами отмечают, что в **20 %** случаев отмечают повышение активности представителей местного сообщества, причастных к проектам. Данные выводы они делают в соответствии с востребованностью собственных проектов у целевой группы, повторным участием в мероприятиях, расширением команды проекта за счет целевой группы.

Межсекторное взаимодействие и партнерство некоммерческих организаций при решении социальных проблем в территориях Красноярского края развито неоднородно. Несмотря на актуальность социальных проектов для территории реализации, заинтересованность местных властей в них избирательна. Проектным командам необходимо самостоятельно выходить на органы МСУ и активно продвигать свои проекты. В своей деятельности некоммерческие организации все больше опираются на гражданскую активность, используют неформальные гражданские сети и ресурс местной благотворительности, добровольчества. Взаимодействие некоммерческих организаций и бизнеса осуществляется чаще всего лишь в форме пожертвований на проведение отдельных мероприятий проектов.

По некоторым проектам, сами СО НКО отметили, что у них налажено взаимодействие с коллегами из других организаций. В связи с чем у некоммерческих организаций появляется социальная и экономическая мотивация к объединению и построению горизонтальной кооперации в части решения социальных проблем в территориях Красноярского края.

В своей работе некоммерческие организации стали больше уделять внимание информированию местного сообщества о ходе реализации



своих проектов. Это позволяет стать некоммерческим организациям более прозрачными по отношению к обществу, повысить их социальную ответственность, а также повышает доверие граждан к «третьему сектору».

Итоги мониторинга свидетельствуют о том, что мероприятия, запланированные в проектах СО НКО, получивших грантовую поддержку из регионального бюджета в 2018 году, выполнены на **80 %** от запланированных показателей. На момент выполнения проектной деятельности более **60 %** мероприятий были востребованными и актуальными для представителей целевой группы проектов. У благополучателей в целом наблюдается положительное отношение к услугам и мероприятиям, реализуемым СО НКО. Фактическое выполнение запланированных мероприятий проектов СО НКО в 2018 году обеспечило не только решение поставленных задач, но и позволило некоммерческим организациям достичь запланированных результатов по основным направлениям проектной деятельности. Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что цели, поставленные в рамках проектов, к моменту их завершения у большей части некоммерческих организаций были достигнуты.

Установленный факт о частичном отклонении фактических показателей от плановых свидетельствует о том, что в рамках реализации Грантополучатели столкнулись с рядом проблем, которые возникли в результате того, что механизм реализации проектов, логичность поставленных задач, а также возможные риски были не достаточно продуманы и спланированы на этапе подачи проектной заявки на конкурсы Программы. В результате, на этапе реализации проекта проектная команда была ограничена в ресурсах (время, деньги) для принятия управленческих решений в управлении изменениями.

Установленные факты о том, что у большинства участников оценки в процессе управления проектом повысился статус, были укреплены и расширены партнерские связи, повысился профессиональный уровень сотрудников и самой организации, был приобретен опыт реализации

проектов на бюджетные средства, благодаря результатам удалось привлечь дополнительные средства позволяют сделать вывод, что значительная часть СО НКО принявшая в 2018 году участие в конкурсах Программы институционально и организационно значительно выросли.

По итогам мониторинга можно сделать вывод, что практики, реализованные в рамках более **25%** проектов, профинансированных в 2018 году проектов успешны, доказательны, имеют устойчивый результат и вправе быть тиражируемыми.

Более **60%** проектов от общего числа поддержанных имели высокую социальную и ресурсную эффективность и достигли заданных результатов.

Однако, многие организации имели сложности с ведением отчетности, а именно:

- Несвоевременно, с нарушением требований договора включились в систему самомониторинга на сайте государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» kras-grant.ru
- Не включились в мониторинг эффективности реализации проектов и своевременно не предоставили для экспертной оценки содержательные, нормативные и отчетные документы, подтверждающие факт реализации проекта
- Не обеспечили доступ экспертов к месту реализации проекта с целью визуального осмотра материальной базы проекта, возможность посещения реализуемых мероприятий проекта
- Нарушили основные требования в части подготовки итогового отчета о реализации проекта. Подтверждающие первичные документы подготовлены не в полном объеме, не в соответствии с требованиями к их оформлению



- Нарушили основные требования договора в части системного размещения информации о ходе реализации проекта в публичном пространстве

Все вышеперечисленные нарушения затрудняли проведение экспертами мониторинга и независимой оценки социальных проектов, получивших поддержку в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» в 2018 году.

Принимая во внимание, что большая часть некоммерческих организаций достигли результатов в ходе реализации проектов, целесообразно продолжить поддержку проектов по разным направлениям деятельности СОНКО с учетом следующих рекомендаций:

Для Совета по краевым социальным грантам:

1. Учитывать результаты мониторинга эффективности реализации социальных проектов, получивших поддержку в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» в 2018 году при проведении следующих конкурсных процедур для СОНКО.

2. Создать и поддерживать в актуальном состоянии список недобросовестных СОНКО, качество реализованных проектов которых было признано низким.

3. Успешные социальные практики и технологии, выявленные в ходе мониторинга размещать на сайте Программы в качестве демонстрации и дальнейшего тиражирования.

4. Использовать статистическую информацию в сравнительном аспекте, полученную в ходе исследований развития институтов гражданского общества для выделения наиболее проблемных областей социальной сферы и обновления ключевых номинаций Программы.

5. Разработать наиболее значимые показатели результативности социальных проектов для развития социальной политики региона по направлениям поддержки СОНКО.

6. Включить в состав Экспертного совета Программы представителей министерств и ведомств социальной сферы.

7. При экспертизе и принятии решений о выделении грантовых средств на реализацию проектов отдавать предпочтение проектам:

- стимулирующим кооперацию организаций для реализации одного проекта
- направленным на создание конкретного продукта - услуги, или замещения платных услуг, создание или перераспределение материальных благ, а не проведение мероприятий
- «продолжающимся» проектам
- использующим труд волонтеров, а также организациям, имеющим многообразные источники входящих средств.

8. При проведении конкурсных процедур особое внимание обращать на качество написания заявки, ее социальную значимость и формулировку результатов проекта в соответствии с наиболее значимыми показателями результативности для развития социальной политики региона.

9. Проводить постоянное обучение и консультирование руководителей и активистов СОНКО с использованием возможностей Краевого центра поддержки общественных инициатив.

Для некоммерческих организаций:

1. При решении социальных проблем и производстве общественных благ действовать в более тесном взаимодействии

с государственными структурами, коммерческими организациями и СМИ.

2. Стремиться к горизонтальной кооперации в среде СО НКО для интеграции интересов и ресурсов при решении социальных проблем
3. Крупным и устойчивым организациям развивать филиалы в территориях Красноярского края
4. Развивать гражданскую активность, ресурс местной благотворительности, добровольчество.
5. Вовлекать жителей муниципальных образований в деятельность по проекту на всех стадиях его реализации.
6. Расширять информирование о деятельности своей организации в сети интернет, развивать социальные связи и транслировать опыт в ходе реализации проекта.
7. Развивать проекты, ориентированные на решение конкретных существующих социальных проблем, в том числе на создание механизмов повышения качества жизни целевой аудитории проектов.
8. Развивать устойчивость своих некоммерческих организаций, в том числе за счет привлечения средств из различных видов источников (не только грантовые средства)
9. Создавать условия для дальнейшего развития реализованных проектов, которые имеют наибольшую эффективность в решении социальных проблем в формате долгосрочных проектов и услуг
10. Системно подходить к планированию и реализации проектов организации. Проводить предварительную оценку действительной полезности иницируемых проектов для как для территории, так и для целевой группы проекта

11. Системно подходить к процедуре подготовки итоговой отчетности по факту реализации проекта, поддержанного в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство»

12. Предусмотреть в проектах внутреннее проведение мониторинговых процедур показателей результативности проекта



8

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ



Приложение №1

список 169 проектов, получивших грантовую поддержку 2018 году

№ пп	Номинация	Территория	Номер заявки	Название проекта	Заявитель	1	Телефон	Эл. адрес
1	Социальная поддержка	Боготол	Д18-1-СП-005	Творчество против недуга	МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) Г.БОГОТОЛА	Демина Татьяна Алексеевна	7(929) 332-5147	resurs.bogotol@mail.ru
2	Астафьевское наследие	Бородино	К18-1-АН-002	Деревья растут для всех	КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Матвеева Татьяна Ивановна	7(391) 211-3639	kba@kraslib.ru
3	Здоровая семья – здоровый край	Красноярск	Д18-1-СК-012	Особые дети - особые семьи	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ДОСУГА «ОЛИМПИА»	Пуштареева Фания Алмазовна	7(908) 220-1676	tiermis@yandex.ru
4	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-1-СП-008	Тропа доверия	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ»	Черняева Татьяна Борисовна	7(391) 290-7293	krasssp@mail.ru
5	Я люблю русский язык	Богучанский р-н	К18-1-РЯ-007	Веселая АБВГДЕЙКа	ФОНД РАЗВИТИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА «ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ»	Мудрак Татьяна Владимировна	7(950) 999-1897	mudrak21921@rambler.ru
6	Астафьевское наследие	Бирилюсский р-н	К18-1-АН-008	Дорога к Астафьеву	ФОНД РАЗВИТИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»	Кузьмина Екатерина Анатольевна	7(913) 177-4730	nkobir@mail.ru
7	Живая память	Иланский р-н	К18-1-ПА-015	История и поколения	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА ИЛАНСКОГО РАЙОНА «БЛАГО ДАРИЮ»	Турейко Татьяна Васильевна	7(391) 732-1975	tyreyko@list.ru
8	Соседское сообщество	Красноярск	К18-1-СО-018	Просто мы - соседи!	КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Матвеева Татьяна Ивановна	7(391) 211-3639	kba@kraslib.ru

9	Советы ветеранов	Канск	K18-1-СВ-003	Сказка потомкам	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ Г.КАНСКА	Хворов Виктор Андреевич	7(391) 613-2964	
10	Здоровая семья – здоровый край	Бирилюсский р-н	Д18-1-СК-028	Мы выбираем Workout	ФОНД РАЗВИТИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»	Кузьмина Екатерина Анатольевна	7(913) 177-4730	nkobir@mail.ru
11	Социальная поддержка	Кежемский р-н	Д18-1-СП-002	Тутти	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»	Измайлов Алексей Николаевич	7(903) 920-1345	izmaylov_aleksey@mail.ru
12	Астафьевское наследие	Рыбинский р-н	K18-1-АН-004	Имя, которым мы гордимся	РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЗЕЛЕНый ОСТРОВ»	Черепанова Татьяна Николаевна	7(923) 356-1037	816490@mail.ru
13	Астафьевское наследие	Канск	K18-1-АН-003	Большие Астафьевские чтения	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ЛУЧ»	Мацола Марина Михайловна	7(923) 284-2570	matsolamarina@yandex.ru
14	Здоровая семья – здоровый край	Шушенский р-н	Д18-1-СК-014	Эквиторра: Тропа к здоровью	КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ «РАВНОВЕСИЕ»	Мухамедиев Тимур Джихатович	7(923) 375-4009	equi2007@rambler.ru, beautybox.krsk@gmail.com
15	Гражданское общество	Красноярск	Д18-1-ГО-001	МедиаКалендарь НКО	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МЕДИА-ГРАМОТНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ «МЕДИА-ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»	Замышляев Данила Андреевич	7(902) 960-5359	mediagramota@yandex.ru
16	Социальная поддержка	Красноярск	П18-1-СП-006	МедиаПарк НКО	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МЕДИА-ГРАМОТНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ «МЕДИА-ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»	Замышляев Данила Андреевич	7(902) 960-5359	mediagramota@yandex.ru
17	Здоровая семья – здоровый край	Норильск	Д18-1-СК-005	Жизнь с плюсом	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «69 ПАРАЛЛЕЛЬ»	Карасева Екатерина Николаевна	7(913) 502-3641	fond69parallel@gmail.com

18	Соседское сообщество	Рыбинский р-н	К18-1-СО-004	Сказкоград	РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЗЕЛЕНый ОСТРОВ»	Черепанова Татьяна Николаевна	7(923) 356-1037	816490@mail.ru
19	Красноярская идентичность	Каратузский р-н	Д18-1-КИ-002	Современный взгляд на старинный обряд	КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ	Штукатурова Наталья Николаевна	7(902) 980-5437	kmo.voi@mail.ru
20	Здоровая семья – здоровый край	Рыбинский р-н	Д18-1-СК-009	Вместе дружная семья	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»	Бобровская Елена Васильевна	7(923) 281-2500	Info@interrasibir.com
21	Социальная поддержка	Железногорск	Д18-1-СП-007	Оказание паллиативной помощи на дому	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ХОСПИС ИМ. ВАСИЛИЯ И ЗОИ СТАРОДУБЦЕВЫХ»	Стародубцев Виктор Васильевич	7(983) 150-0304	svv260@mail.ru
22	Доброе сердце	Боготол	К18-1-ДС-007	А У НАС ВО ДВОРЕ	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ Г.БОГОТОЛА И БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА «ГРАНИТ»	Бысов Николай Геннадьевич	7(923) 288-7307	resurs.bogotol@mail.ru
23	Защищенное детство	Красноярск	Д18-1-ДЕ-008	Подростковый суицид: внедрение программы профилактики в школах	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН И ИХ СЕМЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ «ВЕРБА»	Пальчик Наталья Борисовна	7(391) 231-4847	centerverba@mail.ru
24	Здоровая семья – здоровый край	Железногорск	Д18-1-СК-011	НАСТОЯЩИЕ	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА» КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	Блинникова Марина Александровна	7(391) 977-0578	shorcentr10@gmail.com
25	Защищенное детство	Шарыпово	Д18-1-ДЕ-010	Причал надежды	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ «СПАСЕНИЕ»	Филатов Евгений Федорович	7(950) 416-6701	spasenie-nko@mail.ru
26	Социальная поддержка	Ачинск	Д18-1-СП-020	Почти как иностранцы в России	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ЛЕГКИЙ ШАГ»	Соколова Наталья Дмитриевна	7(960)768-9170	sokolova_i_koni@mail.ru

27	Я люблю русский язык	Ужурский р-н	К18-1-РЯ-006	Чисто по-русски	УЖУРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ	Логинова Людмила Михайловна	7(923) 340-8973	oashabalina@mail.ru
28	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-1-СП-032	Я играю в следж-хоккей!	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА»	Нига Елена Степановна	7(902) 990-0925	openhearts@ya.ru
29	Социальная поддержка	Железногорск	Д18-2-СП-001	Мир глазами особых детей	ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЭТОТ МИР ДЛЯ ТЕБЯ»	Чубенко Ольга Викторовна	7(902)914-8157	voyinova@mail.ru
30	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-1-СП-030	Доступная занятость	АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ИХ СЕМЕЙ «СОЦИАЛЬНАЯ УСАДЬБА «ДОБРАЯ»	Маркевич Анна Николаевна	7(902) 965-5050	autismhelp@mail.ru
31	Красноярская идентичность	Красноярск	Д18-1-КИ-027	Секреты молока	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПТИЦЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА «СИБИРСКОЕ ПОДВОРЬЕ»	Болсуновский Андрей Иванович	7(913) 539-9927	124vip@bk.ru
32	Живая память	Боготол	К18-1-ПА-012	Я бы в армию пошел, пусть меня научат	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ Г.БОГОТОЛА И БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА «ГРАНИТ»	Бысов Николай Геннадьевич	7(923) 288-7307	resurs.bogotol@mail.ru
33	Я люблю русский язык	Балахтинский р-н	К18-1-РЯ-004	Живое слово	БАЛАХТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (РАЙОННАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Кочетков Владимир Борисович	7(391) 483-5118	abarinova-irina@mail.ru
34	Гражданское общество и библиотека	Минусинский р-н	К18-1-ГБ-012	Семейный игровой уголок «БИБЛИОШКА»	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» МИНУСИНСКОГО РАЙОНА	Холощак Людмила Анатольевна	7(913) 524-9904	

35	Доброе сердце	Рыбинский р-н	К18-1-ДС-005	Начни с добрых дел	КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Матвеева Татьяна Ивановна	7(391) 211-3639	kba@kraslib.ru
36	Здоровая семья – здоровый край	Сухобузимский р-н	Д18-1-СК-023	Казачий женсовет спешит на помощь!	СТАНИЧНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА «СУРИКОВСКОЕ»	Некрасова Ольга Николаевна	7(913) 529-7701	nekrasova1952@list.ru
37	Гражданское общество и библиотека	Боготольский р-н	К18-1-ГБ-007	Волшебный лоскуток	БОГОТОЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ПОЗОВУ СЕРДЦА»	Прикатова Наталья Викторовна	7(960) 769-1708	pozovu_serdca@mail.ru
38	Живая память	Краснотуранский р-н	К18-1-ПА-001	Мужество	МЕСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»	Макарова Екатерина Сергеевна	7(391) 342-1332	turan-biblio@rambler.ru
39	Здоровая семья – здоровый край	Дзержинский р-н	Д18-2-СК-001	«Универсиаде 2019 быть!»	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА	Балакина Валентина Ивановна	7(902)945-0230	нет
40	Красноярская идентичность	Боготол	Д18-1-КИ-011	Боготольские кружева	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА СИБИРИ» ГОРОДА БОГОТОЛА	Олейник Денис Сергеевич	7(906) 915-3600	resurs.bogotol@mail.ru
41	Социальная поддержка	Богучанский р-н	Д18-1-СП-014	Активно жить - здоровым быть!	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА	Бордакова Валентина Егоровна	7(983) 149-2989	manzy_ss@mail.ru
42	Социальная поддержка	Шушенский р-н	Д18-1-СП-013	Перекресток	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА	Киселева Галина Ивановна	7(790) 297-2609	shveter@gmail.com
43	Гражданское общество и библиотека	Краснотуранский р-н	К18-1-ГБ-016	«ВИЗИТ: виртуальная информационная зона интеллектуального туризма»	МЕСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»	Макарова Екатерина Сергеевна	7(391) 342-1332	turan-biblio@rambler.ru
44	Соседское сообщество	Боготол	К18-1-СО-024	«Библиопарковка»	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА СИБИРИ» ГОРОДА БОГОТОЛА	Олейник Денис Сергеевич	7(906) 915-3600	resurs.bogotol@mail.ru

45	Защищенное детство	Назаровский р-н	Д18-1-ДЕ-023	Создание «Центра развития и творчества»	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ «СОЗИДАНИЕ» НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	Шипило Людмила Николаевна	7(391) 555-4560	nazbiblioteka@list.ru
46	Здоровая семья – здоровый край	Красноярск	П18-1-СК-007	«Путёвка в жизнь через кадетство»	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КАДЕТСКОГО И МАРИИНСКОГО ДВИЖЕНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КРЕСТ»	Захаров Игорь Евгеньевич	7(391) 251-2496	info@skrest.ru
47	Доброе сердце	Иланский р-н	К18-1-ДС-023	История одного города	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА ИЛАНСКОГО РАЙОНА «БЛАГО ДАРИЮ»	Турейко Татьяна Васильевна	7(391) 732-1975	tureyko@list.ru
48	Гражданское общество и библиотека	Рыбинский р-н	К18-1-ГБ-017	Книги мастеров	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»	Бобровская Елена Васильевна	7(923) 281-2500	Info@interrasibir.com, e.bobrowskaja@gmail.com
49	Социальная поддержка	Богучанский р-н	Д18-1-СП-039	Фотостудия «Старость - в радость»	МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА	Кабанова Галина Анатольевна	7(950) 402-0334	KulichkovalB2009@rambler.ru
50	Гражданское общество	Красноярск	Д18-1-ГО-015	Пещера Кубинская: изменение границ памятника природы	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ СПЕЛЕОЛОГОВ»	Бурмак Игорь Николаевич	7(950) 403-6301	speleoclub24@mail.ru
51	Здоровая семья – здоровый край	Боготол	Д18-1-СК-044	Семейный узелок	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА СИБИРИ» ГОРОДА БОГОТОЛА	Олейник Денис Сергеевич	7(906) 915-3600	resurs.bogotol@mail.ru
52	Астафьевское наследие	Боготол	К18-1-АН-009	Дорога к Астафьеву	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА СИБИРИ» ГОРОДА БОГОТОЛА	Олейник Денис Сергеевич	7(906) 915-3600	resurs.bogotol@mail.ru
53	Наша Универсиада	Абанский р-н	К18-1-УН-007	Мы ЗА!	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ АБАНСКОГО РАЙОНА	Качановская Елена Владимировна	7(923) 339-0700	zarubitskaya2012@yandex.ru
54	Доброе сердце	Каратузский р-н	К18-1-ДС-024	Память поколений от сердца к сердцу	КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ	Штукатурова Наталья Николаевна	7(902) 980-5437	kmo.voi@mail.ru

55	Здоровая семья – здоровый край	Канск	Д18-1-СК-045	Семейный АРТ-дворик, или нескучные выходные	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ЛУЧ»	Мацола Марина Михайловна	7(892) 328-4257	matsolamarina@yandex.ru
56	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-1-СП-040	Мир без барьеров	КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Матвеева Татьяна Ивановна	7(839) 121-1363	kba@kraslib.ru
57	Доброе сердце	Иланский р-н	К18-1-ДС-025	ОБЪЕКТИВная история нашего села	ИЛАНСКАЯ МЕСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОГЛАСИЕ»	Лысикова Татьяна Федоровна	7(960) 754-9047	pankova7474@mail.ru
58	Я люблю русский язык	Красноярск	К18-1-РЯ-008	Школа копирайтинга «Копи Ум»	КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Матвеева Татьяна Ивановна	7(391) 211-3639	mti@kraslib.ru
59	Доброе сердце	Курагинский р-н	К18-1-ДС-026	Традиционное ремесло как эстафета между поколениями	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «НОВЫЙ ДЕНЬ»	Ислентьева Надежда Николаевна	7(908) 012-2369	sibnad@bk.ru
60	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-1-СП-042	Свобода. Трезвый путь	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ «ЕНИСЕЙ»	Назаров Александр Владимирович	7(391) 240-8030	eniseyrc@yandex.ru
61	Социальная поддержка	Назарово	Д18-1-СП-043	Мобильная швейная мастерская #Ниточка иголочка	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ»	Кочетова Ирина Александровна	7(963) 180-7079	ir.kochetova2011@mail.ru
62	Красноярская идентичность	Иланский р-н	Д18-1-КИ-043	Малиновские напевы	ИЛАНСКАЯ МЕСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОГЛАСИЕ»	Лысикова Татьяна Федоровна	7(391) 732-1975	mvc.ilanskiy@mail.ru
63	Здоровая семья – здоровый край	Красноярск	П18-1-СК-008	Детский карнавал	КРАСНОЯРСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖНЫМ И ТВОРЧЕСКИМ ИНИЦИАТИВАМ «ГОРОД МОЛОДЫХ»	Сидоров Алексей Александрович	7(902) 940-7209	tgd23@mail.ru
64	Социальная поддержка	Красноярск	П18-1-СП-008	Третий сектор. Четвертая власть. Укрепление партнерских отношений	АССОЦИАЦИЯ ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЕЙ И ТЕЛЕПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЕНИСЕЙ ТВ»	Злобина Елена Владимировна	7(902) 992-3401	onaoksana@mail.ru
65	Здоровая семья – здоровый край	Красноярск	Д18-1-СК-052	СемьяФест	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ВИДЕО»	Федяева Галина Викторовна	7(913) 509-8303	pozolotina2003@gmail.com

66	Красноярская идентичность	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н	Д18-2-КИ-002	Священная рыба Сакана	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ НГНАСАН» ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	Чунанчар Алексей Николаевич	7(923) 204-4676	nekipuxxa@mail.ru
67	Живая память	Рыбинский р-н	К18-2-ПА-007	Потомкам доблестный пример	РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЗЕЛЕНый ОСТРОВ»	Черепанова Татьяна Николаевна	7(923)356-1037	816490@mail.ru
68	Здоровая семья – здоровый край	Красноярск	Д18-2-СК-003	Солнечная семья выбирает спорт!	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА И ДЕТЕЙ С ДРУГИМИ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ «СОЛНЦЕ В НАШИХ СЕРДЦАХ»	Жилякова Оксана Александровна	7(923) 272-1888	sunkrsk@mail.ru
69	Защищенное детство	Канск	Д18-2-ДЕ-015	«Мир глазами детей»	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ЛУЧ»	Мацола Марина Михайловна	7(923)328-4257	matsolamarina@yandex.ru
70	Живая память	Канск	К18-2-ПА-002	Страницы памяти	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ЛУЧ»	Мацола Марина Михайловна	7(892) 328-4257	matsolamarina@yandex.ru
71	Доброе сердце	Боготол	К18-2-ДС-007	«Диалог поколений: через руки к сердцу»	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА СИБИРИ» Г. БОГОТОЛА	Олейник Денис Сергеевич	7(906)915-3600	resurs.bogotol@mail.ru
72	Здоровая семья – здоровый край	Манский р-н	Д18-2-СК-005	Счастливые семейные лыжи	МЕСТНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА МАНСКОГО РАЙОНА «МАНСКАЯ ЮНОСТЬ»	Кудрявцева	7(391) 492-1337	ddtman@yandex.ru
73	Защищенное детство	Манский р-н	Д18-2-ДЕ-003	Подземная сказка	МЕСТНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА МАНСКОГО РАЙОНА «МАНСКАЯ ЮНОСТЬ»	Кудрявцева Алена Валерьевна	7(391) 492-1337	manyun2016alen@mail.ru
74	Экологическое партнерство	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н	Д18-2-ЭП-001	«Центр сохранения природного и культурного наследия восточного сектора Арктики - «Мыс Зверобой - зимовье Громадское»	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРИРОДА СИБИРИ»	Чапалов Игорь Геннадьевич	7(933) 335-6925	igor.chapalov@yandex.ru

75	Защищенное детство	Красноярск	Д18-2-ДЕ-004	Лаборатория моделирования и спортивного судостроения для студентов и школьников, в том числе из неполных и неблагополучных семей	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г. КРАСНОЯРСКА ДЕТСКИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЕНИСЕЙ-2»	Орлов Сергей Алексеевич	7(923) 280-8375	enisey2@gmail.com
76	Красноярская идентичность	Дзержинский р-н	Д18-2-КИ-005	Диалог поколений	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА	Балакина Валентина Ивановна	7(391) 679-1347	нет
77	Гражданское общество и библиотека	Дзержинский р-н	К18-2-ГБ-002	Самородок Сибири	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА	Балакина Валентина Ивановна	7(391) 679-1347	нет
78	Социальная поддержка	Шарыпово	Д18-2-СП-018	Детский мини-центр «Дружба»	ШАРЫПОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОНД «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ»	Козлюк Юлия Николаевна	7(391)532-6300	kacson.omo35@mail.ru
79	Живая память	Саянский р-н	К18-2-ПА-003	Живая и поныне старина	КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ		7(839) 121-1363	
80	Соседское сообщество	Красноярск	К18-2-СО-007	Замечательный сосед	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МЕДИА-ГРАМОТНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ «МЕДИА-ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»	Замышляев Данила Андреевич	7(953)587-9487	mediagramota@yandex.ru
81	Экологическое партнерство	Красноярск	Д18-2-ЭП-003	Образовательная программа «Первый молодёжный экологический штаб»	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПРИНЕСИ ПОЛЬЗУ»	Исаева Алла Борисовна	7(913) 181-7050	prinesi@inbox.ru
82	Гражданское общество и библиотека	Иланский р-н	К18-2-ГБ-006	БиблиоTime	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА ИЛАНСКОГО РАЙОНА «БЛАГО ДАРИЮ»	Турейко Татьяна Васильевна	7(391) 732-1975	tureyko@list.ru

83	Гражданское общество	Краснотуранский р-н	Д18-2-ГО-002	ЭКОлёнок!	ПЕРСПЕКТИВА, МЕСТНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА	Екатерина Макарова	7(792) 337-8501	ekaterina.bogdan.1627@yandex.ru
84	Социальная поддержка	Канск	Д18-2-СП-016	Зрелое родительство	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «СПЕКТР»	Скаредина Елена Владимировна	7(913)550-7954	elena.skaredina@mail.ru
85	Красноярская идентичность	Красноярск	Д18-3-КИ-001	Перекресток историй	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И ГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ «МАСТЕРСКАЯ ДОБРА»	Переломова Евгения Геннадьевна	7(913)598-9227	evg-perelomova@yandex.ru
86	Доброе сердце	Каратузский р-н	К18-2-ДС-005	И стар и млад - спорту рад	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА	Костюченко Надежда Тихоновна	7(391)372-2794	karatuzsputnik@gmail.com
87	Астафьевское наследие	Рыбинский р-н	К18-2-АН-004	Литературный звездопад В. П. Астафьева	КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Матвеева Татьяна Ивановна	7(391)211-3639	kba@kraslib.ru
88	Доброе сердце	п. Кедровый	К18-2-ДС-001	Жить Легко	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ «МАМА»	Третьякова Лилия Геннадьевна	7(923)366-4331	admkedr.oks@bk.ru
89	Защищенное детство	Красноярск	Д18-2-ДЕ-012	Третье место	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛАБОРАТОРИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»	Турушев Максим Иннокентьевич	7(923)339-1001	Mturushev@yandex.ru
90	Соседское сообщество	Рыбинский р-н	К18-2-СО-009	Мастерская урбанистики «Не столица»	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»	Бобровская Елена Васильевна	7(923)295-1375	interra.sib@inbox.ru
91	Соседское сообщество	Боготольский р-н	К18-2-СО-010	#ТанцПлощадка	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА «ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ БАТЫР»	Корбут Ольга Николаевна	7(933)327-6491	m.familia2016@yandex.ru

92	Здоровая семья – здоровый край	Канск	Д18-2-СК-012	Территория спорта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ТАКТИЧЕСКОГО ПЕЙНТБОЛА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»	Ликонцев Олег Валерьевич	7(923)284-2570	matsolamarina@yandex.ru
93	Соседское сообщество	Каратузский р-н	К18-2-СО-011	«Нескучные выходные»	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА	Костюченко Надежда Тихоновна	7(391)372-2794	karatsputnik@gmail.com
94	Астафьевское наследие	Рыбинский р-н	К18-2-АН-005	Тростевой кукольный театр «Лучик»	РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЗЕЛЕНый ОСТРОВ»	Черепанова Татьяна Леонидовна	7(923)356-1037	816490@mail.ru
95	Красноярская идентичность	Енисейск	Д18-2-КИ-016	Интеллектуальные игры по краеведению Енисейск 400	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ДУХОВНОСТИ»	Еремин Алексей Валерьевич	7(913)189-0279	dima.marilovtzev@yandex.ru
96	Социальная поддержка	Норильск	Д18-2-СП-022	Полярный совёнок	ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ «ГОРЛИЦА»	Хубецова Ирина Николаевна	7(391)938-8634	ierehon@yandex.ru
97	Экологическое партнерство	Красноярск	Д18-2-ЭП-006	Познание начинается с удивления	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ»	Черняева Татьяна Борисовна	7(391)240-5689	krasssp@mail.ru
98	Здоровая семья – здоровый край	Рыбинский р-н	Д18-2-СК-015	Олимпийцы во дворе	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»	Бобровская Елена Васильевна	7(923)281-2500	Info@interrasibir.com
99	Согласие	Красноярск	Д18-2-СГ-004	Форум-театр Шаг навстречу	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»	Бобровская Елена Васильевна	7(923)281-2500	interra.sib@inbox.ru
100	Экологическое партнерство	Красноярск	Д18-2-ЭП-007	Лес вокруг города	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КЛУБ СПЕЛЕОЛОГОВ»	Старикова Марина Геннадьевна	7(779)831-6657	rednost@list.ru
101	Согласие	Красноярск	Д18-2-СГ-005	Общение без границ	КРАСНОЯРСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КЫРГЫЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ»	Батаева Назгуль Жанышбековна	7(913)534-4433	Nka24@list.ru

102	Социальная поддержка	Канск	Д18-2-СП-024	Сказка без границ	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ЛУЧ»	Мацола Марина Михайловна	7(923)284-2570	matsolamarina@yandex.ru
103	Доброе сердце	Абанский р-н	К18-2-ДС-010	Доброволец	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ АБАНСКОГО РАЙОНА	Качановская Елена Владимировна	7(391)632-2495	aban-sovet@yandex.ru
104	Социальная поддержка	Кежемский р-н	Д18-2-СП-025	Лето в развитии	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»	Измайлов Алексей Николаевич	7(953)852-4540	svetoch-centr@mail.ru
105	Здоровая семья – здоровый край	Шарыпово	Д18-2-СК-022	В здоровом теле - здоровый дух!	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ, ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ «ВОИНСКОЕ БРАТСТВО» ГОРОДА ШАРЫПОВО И ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА	Баршинов Владимир Борисович	7(902)992-3220	vladimir.barshinov@mail.ru
106	Доброе сердце	Кежемский р-н	К18-2-ДС-011	Дружба поколений	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»	Измайлов Алексей Николаевич	7(903)920-1345	svetoch-centr@mail.ru
107	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-2-СП-026	Живые струны души	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО «БОСЫЕ ДУШИ»	Энгельгардт Роман Олегович	7(983)201-4893	bosdu@yandex.ru
108	Наша Универсиада	Красноярск	К18-2-УН-003	Обучение волонтеров Зимней универсиады – 2019 навыкам жестовой речи.	ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»	Шурдукалов Владимир Никанорович	7(913)518-6911	AnitaT@yandex.ru
109	Защищенное детство	Пировский р-н	Д18-2-ДЕ-018	Пировский шаг	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»	Яруллина Роза Кашифовна	7(391)662-5331	tiermis@yandex.ru
110	Здоровая семья – здоровый край	Богучанский р-н	Д18-2-СК-026	ХоббиЛенд	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА	Бордакова Валентина Егоровна	7(908)015-8121	mudrak21921@rambler.ru
111	Защищенное детство	Боготольский р-н	Д18-2-ДЕ-019	Твоя личная революция	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА «ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ БАТЫР»	Корбут Ольга Николаевна	7(789)832-0007	korbut99@mail.ru

112	Здоровая семья – здоровый край	Железногорск	Д18-2-СК-027	Научись спасать жизнь!	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»	Колбацких Валерий Валерьевич	7(904)896-2424	fed-zozh@yandex.ru
113	Доброе сердце	Боготольский р-н	К18-2-ДС-015	«Дом без одиночества»	МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «ВО БЛАГО» БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА	Михальченко Анна Ивановна	7(923)350-1695	mbfsp_voblago@mail.ru
114	Соседское сообщество	Боготольский р-н	К18-2-СО-020	«На радость людям всем селом»	МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «ВО БЛАГО» БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА	Михальченко Анна Ивановна	7(923)350-1695	mbfsp_voblago@mail.ru
115	Социальная поддержка	Ужурский р-н	Д18-2-СП-031	Вместе мы можем ВСЕ! - спортивная площадка для занятий адаптивной физической культурой в городе Ужуре	УЖУРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ	Логинова Людмила Михайловна	7(950)406-3712	loginova65g@mail.ru
116	Соседское сообщество	Боготольский р-н	К18-2-СО-021	Красота и уют все село соберут	БОГОТОЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ПО ЗОВУ СЕРДЦА»	Прикатова Наталья Викторовна	7(960)769-1708	pozovu_serdca@mail.ru
117	Гражданское общество и библиотека	Каратузский р-н	К18-2-ГБ-017	Библиотека - теплый дом	КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ	Штукатурова Наталья Николаевна	7(902)980-5437	kmo.voi@mail.ru
118	Красноярская идентичность	Красноярск	Д18-2-КИ-028	Широко открытыми глазами	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГЕНТСТВО ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ «КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД»	Олейник Виктор Зиновьевич	7(902)966-9816	oleynikvictor@gmail.com
119	Доброе сердце	Ачинск	К18-2-ДС-017	1-два-три-зеленый	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ЛЕГКИЙ ШАГ»	Соколова Наталья Дмитриевна	7(960)768-9170	sokolova_i_koni@mail.ru
120	Гражданское общество	Канск	Д18-2-ГО-008	Защитим город от пожаров	КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»	Горюнов Павел Анатольевич	7(391)201-8848	kko.vdpo@mail.ru
121	Защищенное детство	Иланский р-н	Д18-2-ДЕ-020	Без громких слов	ИЛАНСКАЯ МЕСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОГЛАСИЕ»	Лысикова Татьяна Федоровна	7(391)732-1975	mvc.ilanskiy@mail.ru

122	Здоровая семья – здоровый край	Красноярск	Д18-2-СК-031	Краевой киберпатруль	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ «ЕНИСЕЙ»	Назаров Александр Владимирович	7(391)240-8030	eniseyrc@yandex.ru
123	Защищенное детство	Богучанский р-н	Д18-2-ДЕ-022	Спортивное наставничество	ФОНД СОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ ФУТБОЛЬНО-ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «АНГАРА»	Рукосуев Сергей Николаевич	7(908)221-3836	rukosuev-bog@mail.ru
124	Социальная поддержка	Норильск	Д18-2-СП-036	Смакуй!	ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ «ЛЕСТВИЦА»	Хубецова Ирина Николаевна	7(913)531-0409	ierehon@yandex.ru
125	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-2-СП-037	Играем жизнь	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА»	Нига Елена Степановна	7(902)990-0925	openhearts@ya.ru
126	Соседское сообщество	Боготол	К18-2-СО-022	Литературная Аллея	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА СИБИРИ» ГОРОДА БОГОТОЛА	Олейник Денис Сергеевич	7(906)915-3600	resurs.bogotol@mail.ru
127	Я люблю русский язык	Рыбинский р-н	К18-2-РЯ-002	Мы - русские!	КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Матвеева Татьяна Ивановна	7(391)211-3639	kba@kraslib.ru
128	Здоровая семья – здоровый край	Дивногорск	Д18-2-СК-036	МАКСИ	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ «ДЕКА» (ДИВНОГОРСКАЯ ЕДИНАЯ КОМАНДА АКТИВА)	Верхотуров Илья Валерьевич	7(913)832-4147	Go.Deka2015@mail.ru
129	Соседское сообщество	Балахтинский р-н	К18-2-СО-024	Строительство детской площадки «Цветик-семицветик»	МЕСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ «ПАРТНЕР»	Климанова Римма Борисовна	7(391)482-1531	metod_12@mail.ru
130	Экологическое партнерство	Красноярск	П18-2-ЭП-004	Информационная система учёта городских зеленых насаждений «Посчитай меня!»	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ «ЖИВОЙ ГОРОД»	Заступенко Анастасия Николаевна	7(903)922-2039	leommaann@yandex.ru
131	Защищенное детство	Красноярск	Д18-2-ДЕ-029	“Лаборатория научного творчества Ньютон Парк”	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МИР ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ НАУКИ»	Тимофеенко Иван Алексеевич	7(923)579-4009	ivan.timofeenko@gmail.com

132	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-2-СП-041	«Здоровое долголетие- Образовательно- оздоровительная программа для пожилых»	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ПОДАРИ УЛЫБКУ»	Николаенко Сергей Алексеевич	7(839)127-6659	mail@zubnik32.ru
133	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-2-СП-042	Отдых без родителей	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «АЭРОСТАТ»	Мезенцев Владимир Александрович	7(923)284-5496	bolsunovskayan@gmail.com
134	Экологическое партнерство	Красноярск	П18-2-ЭП-008	Великий зелёный поход... начни с себя!	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗЕЛЁНЫЙ КОШЕЛЁК»	Спожакина Татьяна Васильевна	7(950)984-8211	vedotr@mail.ru
135	Экологическое партнерство	Красноярск	П18-2-ЭП-007	Экологический патруль	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ СПЕЛЕОЛОГОВ»	Бурмак Игорь Николаевич	7(950)403-6301	speleoclub24@mail.ru
136	Защищенное детство	Краснотуранский р-н	Д18-3-ДЕ-001	В Краснотуранске молодежный «БУНТ: бюро умных, начитанных, творческих»	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERANОВ - ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА	Богачук Нина Ильинична	7(391)342-1403	turan-biblio@rambler.ru
137	Экологическое партнерство	Красноярск	Д18-3-ЭП-007	Социально- государственное партнерство, как эффективный путь повышения качества атмосферного воздуха	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ И СВОБОДНЫЙ ОТ КОРРУПЦИИ КРАЙ»	Гудовский Павел Геннадьевич	7(905)976-1346	ookrkr@mail.ru
138	Экологическое партнерство	Манский р-н	Д18-3-КИ-002	Заманье – центр экологического туризма и краеведения	ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «РОСТ»	Чайкина Ульяна Андреевна	7(391)286-5334	fund_rost@mail.ru
139	Красноярская идентичность	Краснотуранский р-н	Д18-3-КИ-003	Я русский и этим горжусь!	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERANОВ - ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА	Богачук Нина Ильинична	7(391)342-1403	turan-biblio@rambler.ru
140	Соседское сообщество	Краснотуранский р-н	К18-3-СО-001	Эко-арт под открытым небом	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERANОВ - ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА	Богачук Нина Ильинична	7(391)342-1403	turan-biblio@rambler.ru

141	Красноярская идентичность	Красноярск	Д18-3-КИ-005	Искусство открывает Антарктиду	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КАДЕТСКОГО И МАРИИНСКОГО ДВИЖЕНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КРЕСТ»	Захаров Игорь Евгеньевич	7(391)251-2496	info@skrest.ru
142	Экологическое партнерство	Абанский р-н	Д18-3-ЭП-002	Эко-десант	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ АБАНСКОГО РАЙОНА	Гартман Юлия Евгеньевна	7(391)6322-608	Aban-sovet@yandex.ru
143	Согласие	Красноярск	Д18-3-СГ-001	Перезагрузка	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧУВАШСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ	Храмов Геннадий Иванович	7(913)529-5455	chuvashkrsk@yandex.ru
144	Красноярская идентичность	Эвенкийский муниципальный район	Д18-3-КИ-006	Стрелок	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА ЭВЕНКИИ»	Иванов Иван Иванович	7(391)703-1239	ivanov1510@yandex.ru
145	Красноярская идентичность	Красноярск	Д18-3-КИ-007	Красноярск, расти и процветай!	КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВETERANОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ	Басуев Дмитрий Алексеевич	7(391)226-1220	veteran@admkrsk.ru
146	Социальная поддержка	Курагинский р-н	Д18-3-СП-004	Связующая нас нить	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «НОВЫЙ ДЕНЬ»	Ислентьева Надежда Николаевна	7(908)012-2369	sibnad@bk.ru
147	Экологическое партнерство	Назарово	Д18-3-ЭП-003	Система общественного контроля качества питьевой воды на территории городского округа Назарово	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НООСФЕРА»	Морозова Ольга Григорьевна	7(953)590-3125	ogmoroz45@mail.ru
148	Защищенное детство	Красноярск	Д18-3-ДЕ-002	Технопарк «Лабиринт безопасности»	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ «АЛЬТЕРНАТИВА»	Кудрявцев Дмитрий Владимирович	7(391)277-7793	alter2.0@yandex.ru
149	Социальная поддержка	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н	Д18-3-СП-007	Информационно - консультационный центр семейной (родовой) общины	СЕМЕЙНАЯ (РОДОВАЯ) ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА «ХАСКИ-ТЫАЛ» (ХАСКИ ВЕТЕР)	Теребихина Анастасия Ивановна	7(902)914-4733	astyugin@yandex.ru

150	Гражданское общество и библиотека	Курагинский р-н	К18-3-ГБ-003	Игра в Жизнь	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «НОВЫЙ ДЕНЬ»	Ислентьева Надежда Николаевна	7(908)012-2369	sibnad@bk.ru
151	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-3-СП-008	Недоступное доступно	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ «ВЕРХОМ БЕЗ ГРАНИЦ»	Семенова Анна Михайловна	7(903)959-4823	vbg_24@mail.ru
152	Согласие	Красноярск	Д18-3-СГ-003	Сильный должен быть добрым!	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»	Голованов Дмитрий Владимирович	7(391)212-4739	sjkrsk@yandex.ru
153	Соседское сообщество	Красноярск	К18-3-СО-003	Собачий вопрос	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДОВ «ЧИСТОГРАД»	Чинякова Ольга Николаевна	7(923)354-5765	rostok-life@mail.ru
154	Соседское сообщество	Каратузский р-н	К18-3-СО-004	ДоброДар	КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ	тукатурова Наталья Николаевна	7(902)980-5437	kmo.voi@mail.ru
155	Экологическое партнерство	Красноярск	Д18-3-ЭП-004	Воспитание экологической культуры и экологической грамотности населения различных возрастных категорий посредством проведения культурно-просветительских мероприятий	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»	Кириенко Мария Алексеевна	7(983)286-1062	lma7878@mail.ru
156	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-3-СП-010	Где воля - там и победа	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ»	Черняева Татьяна Борисовна	7(902)940-5689	krasssp@mail.ru
157	Здоровая семья – здоровый край	Красноярск	Д18-3-СК-006	Команда инклюзивных побед	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ»	Пискун Светлана Владимировна	7(983) 286-3347	living_breath@mail.ru
158	Социальная поддержка	Красноярск	Д18-3-СП-011	Создание инфраструктуры поддержки детям с ментальными нарушениями и их семьям	ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»	Щурдукалов Владимир Никанорович	7(902)924-2242	AnitaT@yandex.ru

159	Здоровая семья – здоровый край	Красноярск	Д18-3-СК-008	Дети и их родители	МОЛОДЕЖНАЯ ОБОРОННАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПАТРИОТ» КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	Калугин Олег Геннадьевич	7(933)322-8788	kkoovstkpatriot@yandex.ru
160	Защищенное детство	Красноярск	Д18-3-ДЕ-004	Ребенок в центре внимания	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН И ИХ СЕМЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ «ВЕРБА»	Пальчик Наталья Борисовна	7(391)231-4847	CENTERVERBA@MAIL.RU
161	Астафьевское наследие	Каратузский р-н	К18-3-АН-001	Живая дорога писателя	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА	Костюченко Надежда Тихоновна	7(391)372-3289	bezrukikh.90@mail.ru
162	Красноярская идентичность	Красноярск	Д18-3-КИ-009	Город глазами художника	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ «ГОРОД ДЕТСТВА»	Тетерина Светлана Валерьевна	7(902)940-7209	tgd23@mail.ru
163	Экологическое партнерство	Дивногорск	Д18-3-ЭП-005	Эко-тропа «Лес LTS»	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ «ДЕКА» (ДИВНОГОРСКАЯ ЕДИНАЯ КОМАНДА АКТИВА)	Верхотуров Илья Валерьевич	7(913)832-4147	go.Deka2015@mail.ru
164	Согласие	Красноярск	Д18-3-СГ-004	Центр социальной адаптации трудовых мигрантов	РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «ОПОРА»	Козловская Марина Александровна	7(905)976-6345	kozlovskya.ma@gmail.com
165	Экологическое партнерство	Красноярск	Д18-3-ЭП-009	Сохранить и приумножить!	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КЛУБ СПЕЛЕОЛОГОВ»	Старикова Марина Геннадьевна	7(983)166-5717	rednost@list.ru
166	Социальная поддержка	Минусинский р-н	Д18-3-СП-013	В гончары бы я пошел...	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ»	Холощак Людмила Анатольевна	7(923)280-6685	domremesel2015@yandex.ru
167	Экологическое партнерство	Красноярск	Д18-3-ЭП-010	Эко-Эхо	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»	Бобровская Елена Васильевна	7(923)281-2500	interra.sib@inbox.ru

168	Защищенное детство	Красноярск	Д18-3-ДЕ-006	Комплексная программа по профилактики деликвентного поведения несовершеннолетних находящихся в группе риска «Выход из лабиринта»	КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»	Спирина Наталья Михайловна	7(391)212-2639	detfond_spirina@mail.ru
169	Экологическое партнерство	Железногорск	Д18-3-ЭП-011	Детский эколого-информационный центр «ЭкоЛабораториум»	КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУЛЬТУРНЫЙ КОД: КНИГА, ОТКРЫТОСТЬ, ДОБРОТВОРЧЕСТВО»	Столетова Юлия Олеговна	7(913)522-0368	bibgaidara@gmail.com

Приложение №2

Список 25 проектов – победителей, реализованных в 2018 году наиболее эффективно

№	Группа районов	Территории	Полное наименование некоммерческой организации	Название проекта	Руководитель проекта	Телефон	Эл. почта
1	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная детско-молодежная общественная организация «Ассоциация любительского видео»	СемьяФест	Федяева Галина Викторовна	7(913) 509-8303	pozolotina2003@gmail.com
2	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация содействия благоустройству городов «Чистоград»	Собачий вопрос	Чинякова Ольга Николаевна	7(923)354-5765	rostok-life@mail.ru
3	I группа	г. Железногорск	Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края	НАСТОЯЩИЕ	Блинникова Марина Александровна	+7(391) 977-0578	shorcentr10@gmail.com
4	III группа	Боготольский район	Местная общественная организация Боготольского района «Туристический клуб БАТbP»	#ТанцПлощадка	Корбут Ольга Николаевна	7(933)327-6491	m.familia2016@yandex.ru
5	I группа	г. Дивногорск	Красноярская региональная молодежная общественная организация по реализации молодежных программ и проектов «Дека» (Дивногорская единая команда актива)	Эко-тропа «Лес LTS»	Верхотуров Илья Валерьевич	7(913)832-4147	Bratan91678@yandex.ru
6	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация по развитию городской среды «Живой город»	Информационная система учёта городских зеленых насаждений «Посчитай меня!»	Заступенко Анастасия Николаевна	7(903)922-2039	leommaann@yandex.ru

7	IV группа	Шушенский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Шушенского района	Перекресток	Шумаева Наталья Николаевна	89 083 258 210,00	shveter@gmail.com
8	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области культуры «Альтернатива»	Технопарк «Лабиринт безопасности»	Кудрявцев Дмитрий Владимирович	7(913)557-1712	alter2.0@yandex.ru
9	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация Межрегиональный ресурсный центр медиа-грамотности и информационного сопровождения «МЕДИА-ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»	МедиаПарк НКО	Замышляева Ирина	89029605359	<media-irina24@yandex.ru
10	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего»	Третье место	Турушев Максим Иннокентьевич	7(923)339-1001	Mturushev@yandex.ru
11	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей»»	Свобода. Трезвый путь	Ольшанский Дмитрий Владимирович	8-902-920-88-00	eniseyrc@yandex.ru
12	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «ВЕРБА»	Подростковый суицид: внедрение программы профилактики в школах	Пальчик Наталья Борисовна	7(391) 231-4847	centerverba@mail.ru

13	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация «Центр детского досуга «Олимпия»	Особые дети - особые семьи	Пуштарыкова Фания Алмазовна	7(908)220-1676	tiermis@yandex.ru
14	VII группа	Иланский район	Иланская местная женская общественная организация «Согласие»	Малиновские напевы	представитель команды проекта Панкова Виталия Николаевна 89632612400	Лысикова Татьяна Федоровна 7(960)754-9047	mvc.ilanskiy@mail.ru
15	VI группа	г. Норильск	Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица»	Смакуй!	Хубецова Ирина Николаевна	7(913)531-0409	ierehon@yandex.ru
16	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская местная общественная организация «Кыргызская национально-культурная автономия»	Общение без границ	Батаева Назгуль Жанышбековна	7(913)534-4433	Nka24@list.ru
17	III группа	г. Боготол	Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола	Боготольские кружева	Олейник Денис Сергеевич	7(906)915-3600	galinarahalina@mail.ru
18	IV группа	Шушенский район	Красноярское региональное экологическое общественное движение в поддержку особо охраняемых природных территорий, образования и культуры «Равновесие»	Эквитерра: Тропа к здоровью	Кувардина Софья Евгеньевна	8-953-588-96-09	svietlana_glyzina@mail.ru

19	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере социальной поддержки лиц с расстройствами аутистического спектра и их семей «Социальная усадьба «Добрая»	Доступная занятость	Маркевич Анна Николаевна	7(902) 965-5050	autismhelp@mail.ru
20	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна и детей с другими наследственными заболеваниями «Солнце в наших сердцах»	Солнечная семья выбирает спорт!	Жилякова Оксана Александровна	7(923) 272-1888	sunkrsk@mail.ru
21	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация содействия предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями «Подари улыбку»	«Здоровое долголетие- Образовательно-оздоровительная программа для пожилых»	Николаенко Сергей Алексеевич	7(839)127-6659	mail@zubnik32.ru
22	III группа	г. Боготол	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья «Легкий шаг»	Почти как иностранцы в России	Соколова Наталья Дмитриевна	7(960)768-9170	sokolova_i_koni@mail.ru

23	г. Красноярск	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район	Красноярская региональная общественная экологическая организация «Природа Сибири»	«Центр сохранения природного и культурного наследия восточного сектора Арктики - «Мыс Зверобой - зимовье Громадское»	Чапалов Игорь Геннадьевич	89333356925	igor.chapalov@yandex.ru
24	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация развития прикладного творчества, добровольчества и гармоничной семьи «Мастерская Добра»	Перекресток историй	Переломова Евгения Геннадьевна	7(913) 598-9227	evg-perelomova@yandex.ru
25	II группа	г. Дивногорск	Красноярская региональная молодежная общественная организация по реализации молодежных программ и проектов «Дека» (Дивногорская единая команда актива)	МАКСИ	Верхотуров Илья Валерьевич	7(913)832-4147	Bratan91678@yandex.ru

Приложение №3

Рейтинг 169 проектов - победителей по итогам мониторинга информации на сайте kras-grant.ru

№ пп	Номинация	Группа районов	Территория	Наименование организации	Название проекта	Общий балл
1.	Здоровая семья – здоровый край	III группа	Бирилюсский район	Фонд развития Бирилюсского района «Перспектива»	Мы выбираем Workout	12
2.	Здоровая семья – здоровый край	III группа	г. Боготол	Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола	Семейный узелок	12
3.	Доброе сердце	III группа	г. Боготол	Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола	Диалог поколений: через руки к сердцу	12
4.	Соседское сообщество	III группа	г. Боготол	Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола	Литературная Аллея	12
5.	Красноярская идентичность	III группа	г. Боготол	Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола	Боготольские кружева	12
6.	Здоровая семья – здоровый край	I группа	г. Железногорск	Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края	НАСТОЯЩИЕ	12
7.	Здоровая семья – здоровый край	IV группа	Шушенский район	Красноярское региональное экологическое общественное движение в поддержку особо охраняемых природных территорий, образования и культуры «Равновесие»	Эквитерра: Тропа к здоровью	12
8.	Согласие	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская местная общественная организация «Кыргызская национально-культурная автономия»	Общение без границ	12
9.	Соседское сообщество	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация Межрегиональный ресурсный центр медиа-грамотности и информационного сопровождения «МЕДИА-ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»	Замечательный сосед	12

10.	Я люблю русский язык	I группа	Рыбинский район	Красноярская библиотечная ассоциация	Мы - русские!	12
11.	Астафьевское наследие	I группа	Рыбинский район	Красноярская библиотечная ассоциация	Литературный звездопад В. П. Астафьева	12
12.	Живая память	I группа	Рыбинский район	Региональная молодежная общественная организация программ общественного развития Красноярского края «Зеленый остров»	Потомкам доблестный пример	11
13.	Соседское сообщество	I группа	Рыбинский район	Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА»	Мастерская урбанистики «Не столица»	11
14.	Здоровая семья – здоровый край	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна и детей с другими наследственными заболеваниями «Солнце в наших сердцах»	Солнечная семья выбирает спорт!	11
15.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация Межрегиональный ресурсный центр медиа-грамотности и информационного сопровождения «МЕДИА-ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»	МедиаПарк НКО	11
16.	Социальная поддержка	IV группа	Шушенский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Шушенского района	Перекресток	11
17.	Живая память	III группа	г. Боготол	Местная Общественная организация участников боевых действий г. Боготола и Боготольского района «ГРАНИТ»	Я бы в армию пошел, пусть меня научат	11
18.	Соседское сообщество	I группа	Рыбинский район	Региональная молодежная общественная организация программ общественного развития Красноярского края «Зеленый остров»	Сказкоград	11
19.	Согласие	г. Красноярск	г. Красноярск	Региональная ассоциация социальной поддержки «ОПОРА»	Центр социальной адаптации трудовых мигрантов	11

20.	Красноярская идентичность	г. Красноярск	г. Красноярск	Ассоциация телевещателей и телепроизводителей Красноярского края «Енисей ТВ»	Третий сектор. Четвертая власть. Укрепление партнерских отношений	11
21.	Живая память	VII группа	г. Канск	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки общественных инициатив «Луч»	Страницы памяти	11
22.	Соседское сообщество	III группа	г. Боготол	Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола	Библиопарковка	10
23.	Экологическое партнерство	г. Красноярск	г. Красноярск	Местная общественная организация «Красноярский городской клуб спелеологов»	Экологический патруль	10
24.	Социальная поддержка	III группа	г. Боготол	Местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г. Боготола	Творчество против недуга	10
25.	Экологическое партнерство	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная экологическая организация «Природа Сибири»	«Центр сохранения природного и культурного наследия восточного сектора Арктики - «Мыс Зверобой - зимовье Громадское»	10
26.	Здоровая семья – здоровый край	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная детско-молодежная общественная организация «Ассоциация любительского видео»	СемьяФест	10
27.	Экологическое партнерство	г. Красноярск	г. Красноярск	Благотворительный фонд «Принеси пользу»	Образовательная программа «Первый молодежный экологический штаб»	10
28.	Социальная поддержка	IV группа	Минусинский район	Местная Общественная Молодежная Организация содействия решению социальных проблем «Добровольное Объединение Молодежи» Минусинского района	В гончары бы я пошёл...	10

29.	Астафьевское наследие	III группа	Бирилюсский район	Фонд развития Бирилюсского района «Перспектива»	Дорога к Астафьеву	10
30.	Доброе сердце	I группа	Рыбинский район	Красноярская библиотечная ассоциация	Начни с добрых дел	10
31.	Экологическое партнерство	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ И СВОБОДНЫЙ ОТ КОРРУПЦИИ КРАЙ»	Социально-государственное партнерство, как эффективный путь повышения качества атмосферного воздуха	10
32.	Соседское сообщество	III группа	Боготольский район	Местная общественная организация Боготольского района «Туристический клуб БАТЫР»	#ТанцПлощадка	10
33.	Доброе сердце	III группа	Боготольский район	Местный благотворительный фонд социальной поддержки «Во благо» Боготольского района	Дом без одиночества	10
34.	Соседское сообщество	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская библиотечная ассоциация	Просто мы - соседи!	9
35.	Доброе сердце	V группа	Абанский район	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	Доброволец	9
36.	Здоровая семья – здоровый край	I группа	Рыбинский район	Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА»	Вместе дружная семья	9
37.	Соседское сообщество	III группа	Боготольский район	Местный благотворительный фонд социальной поддержки «Во благо» Боготольского района	На радость людям всем селом	9
38.	Защищенное детство	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «ВЕРБА»	Подростковый суицид: внедрение программы профилактики в школах	9
39.	Здоровая семья – здоровый край	I группа	Рыбинский район	Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА»	Олимпийцы во дворе	9

40.	Здоровая семья – здоровый край	I группа	г. Дивногорск	Красноярская региональная молодежная общественная организация по реализации молодежных программ и проектов «Дека» (Дивногорская единая команда актива)	МАКСИ	9
41.	Соседское сообщество	III группа	Боготольский район	Боготольская местная молодежная общественная организация поддержки общественных инициатив «По зову сердца»	Красота и уют все село соберут	9
42.	Защищенное детство	III группа	Назаровский район	Местная общественная организация по социальному развитию «Созидание» Назаровского района Красноярского края	Создание «Центра развития и творчества»	9
43.	Социальная поддержка	III группа	г. Ачинск	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья «Легкий шаг»	Почти как иностранцы в России	9
44.	Социальная поддержка	VII группа	г. Канск	Автономная некоммерческая организация поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Спектр»	Зрелое родительство	9
45.	Экологическое партнерство	II группа	Манский район	Фонд поддержки социально-экономического развития «РОСТ»	Заманье – центр экологического туризма и краеведения	9
46.	Астафьевское наследие	I группа	Рыбинский район	Региональная молодежная общественная организация программ общественного развития Красноярского края «Зеленый остров»	Имя, которым мы гордимся	9
47.	Гражданское общество и библиотека	I группа	Рыбинский район	Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА»	Книги мастеров	9
48.	Доброе сердце	III группа	г. Боготол	Местная Общественная организация участников боевых действий г. Боготола и Боготольского района «ГРАНИТ»	А У НАС ВО ДВОРЕ	9
49.	Соседское сообщество	IV группа	Краснотуранский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Краснотуранского района	Эко-арт под открытым небом	9

50.	Наша Универсиада	V группа	Абанский район	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	Мы ЗА!	8
51.	Гражданское общество	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация Межрегиональный ресурсный центр медиа-грамотности и информационного сопровождения «МЕДИА-ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»	МедиаКалендарь НКО	8
52.	Защищенное детство	г. Красноярск	г. Красноярск	Местная общественная организация г. Красноярска Детский спортивно-технический клуб «Енисей-2»	Лаборатория моделирования и спортивного судостроения для студентов и школьников, в том числе из неполных и неблагополучных семей	8
53.	Здоровая семья – здоровый край	II группа	г. Шарыпово	Местная общественная организация ветеранов войны в Афганистане, других локальных войн и чрезвычайных ситуаций «Воинское братство» города Шарыпово и Шарыповского района	В здоровом теле - здоровый дух!	8
54.	Согласие	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА»	Форум-театр Шаг навстречу	8
55.	Социальная поддержка	II группа	г. Шарыпово	Шарыповский городской фонд «Социальная защита населения»	Детский мини-центр «Дружба»	8
56.	Здоровая семья – здоровый край	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей»»	Краевой киберпатруль	8
57.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере социальной поддержки лиц с расстройствами аутистического спектра и их семей «Социальная усадьба «Добрая»	Доступная занятость	8

58.	Гражданское общество	IV группа	Краснотуранский район	Местная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив Краснотуранского района «Перспектива»	ЭКОлёнок!	8
59.	Социальная поддержка	VI группа	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район	Семейная (родовая) община коренных малочисленных народов Севера «Хаскитыал» (Хаски ветер)	Информационно - консультационный центр семейной (родовой) общины	8
60.	Наша Универсиада	г. Красноярск	г. Красноярск	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации»	Обучение волонтеров Зимней универсиады – 2019 навыкам жестовой речи.	8
61.	Астафьевское наследие	VII группа	г. Канск	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки общественных инициатив «Луч»	Большие Астафьевские чтения	8
62.	Астафьевское наследие	III группа	г. Боготол	Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола	Дорога к Астафьеву	8
63.	Живая память	VII группа	Саянский район	Красноярская библиотечная ассоциация	Живая и поныне старина	7
64.	Красноярская идентичность	VII группа	Иланский район	Иланская местная женская общественная организация «Согласие»	Малиновские напевы	7
65.	Экологическое партнерство	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация по развитию городской среды «Живой город»	Информационная система учёта городских зеленых насаждений «Посчитай меня!»	7
66.	Защищенное детство	V группа	Пировский район	Красноярская региональная общественная организация «Развитие культурного наследия»	Пировский шаг	7
67.	Здоровая семья – здоровый край	VII группа	г. Канск	Автономная некоммерческая организация «Федерация тактического пейнтбола Красноярского края»	Территория спорта	7

68.	Социальная поддержка	I группа	г. Железногорск	Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя»	Мир глазами особых детей	7
69.	Красноярская идентичность	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация содействия развитию птицеводства и животноводства «Сибирское подворье»	Секреты молока	7
70.	Социальная поддержка	V группа	Кежемский район	Автономная некоммерческая организация «ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»	Тутти	7
71.	Красноярская идентичность	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация развития прикладного творчества, добровольчества и гармоничной семьи «Мастерская Добра»	Перекресток историй	7
72.	Красноярская идентичность	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская городская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов	Красноярск, расти и процветай!	7
73.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация Специализированный центр оздоровительной верховой езды «Верхом без границ»	Недоступное доступно	7
74.	Экологическое партнерство	I группа	г. Железногорск	Красноярская региональная общественная организация «Культурный КОД: Книга, Открытость, Добротворчество»	Детский эколого-информационный центр «ЭкоЛабораториум»	7
75.	Доброе сердце	VII группа	Иланский район	Иланская местная женская общественная организация «Согласие»	ОБЪЕКТИВная история нашего села	7
76.	Я люблю русский язык	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская библиотечная ассоциация	Школа копирайтинга «Копи Ум»	7
77.	Гражданское общество	г. Красноярск	г. Красноярск	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Пещера Кубинская: изменение границ памятника природы	6
78.	Здоровая семья – здоровый край	VII группа	г. Канск	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки общественных инициатив «Луч»	Семейный АРТ-дворик, или нескучные выходные	6
79.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца»	Я играю в следж-хоккей!	6

80.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей»»	Свобода. Трезвый путь	6
81.	Гражданское общество	VII группа	г. Канск	Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»	Защитим город от пожаров	6
82.	Защищенное детство	II группа	Манский район	Местная детская общественная организация свободного творчества Манского района «Манская юность»	Подземная сказка	6
83.	Защищенное детство	III группа	Боготольский район	Местная общественная организация Боготольского района «Туристический клуб БАТЫР»	Твоя личная революция	6
84.	Защищенное детство	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная молодежная общественная организация «Мир познавательной науки»	Лаборатория научного творчества Ньютон Парк	6
85.	Социальная поддержка	VII группа	г. Канск	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки общественных инициатив «Луч»	Сказка без границ	6
86.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца»	Играем жизнь	6
87.	Здоровая семья – здоровый край	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация содействия развитию кадетского и Мариинского движения «Северный крест»	Путёвка в жизнь через кадетство	6
88.	Согласие	г. Красноярск	г. Красноярск	Региональная общественная организация «Союз журналистов Красноярского края»	Сильный должен быть добрым!	6
89.	Защищенное детство	IV группа	Краснотуранский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Краснотуранского района	В Краснотуранске молодежный «БУНТ: бюро умных, начитанных, творческих»	6

90.	Красноярская идентичность	IV группа	Краснотуранский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Краснотуранского района	Я русский и этим горжусь!	6
91.	Красноярская идентичность	г. Красноярск	г. Красноярск	Общественная организация Красноярская региональная Чувашская национально-культурная автономия	Перезагрузка	6
92.	Гражданское общество и библиотека	III группа	Боготольский район	Боготольская местная молодежная общественная организация поддержки общественных инициатив «По зову сердца»	Волшебный лоскуток	6
93.	Доброе сердце	IV группа	Курагинский район	Красноярская региональная общественная организация поддержки многодетных семей «Новый день»	Традиционное ремесло как эстафета между поколениями	6
94.	Живая память	IV группа	Краснотуранский район	Местная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив Краснотуранского района «Перспектива»	Мужество	6
95.	Здоровая семья – здоровый край	I группа	Сухобузимский район	Станичное казачье общество Сухобузимского района «Суриковское»	Казачий женсовет спешит на помощь!	5
96.	Защищенное детство	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего»	Третье место	5
97.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская библиотечная ассоциация	Мир без барьеров	5
98.	Защищенное детство	VII группа	г. Канск	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки общественных инициатив «Луч»	Мир глазами детей	5
99.	Гражданское общество и библиотека	IV группа	Краснотуранский район	Местная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив Краснотуранского района «Перспектива»	ВИЗИТ: виртуальная информационная зона интеллектуального туризма	5

100.	Я люблю русский язык	II группа	Балахтинский район	Балахтинская территориальная (районная) организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации	Живое слово	5
101.	Доброе сердце	VII группа	Иланский район	Благотворительный фонд местного сообщества Иланского района «Благо Дарю»	История одного города	5
102.	Экологическое партнерство	II группа	г. Дивногорск	Красноярская региональная молодежная общественная организация по реализации молодежных программ и проектов «Дека» (Дивногорская единая команда актива)	Эко-тропа «Лес LTS»	5
103.	Доброе сердце	III группа	г. Ачинск	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья «Легкий шаг»	1-два-три-зеленый	4
104.	Защищенное детство	II группа	г. Шарыпово	Красноярская региональная общественная организация помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Спасение»	Причал надежды	4
105.	Красноярская идентичность	IV группа	Каратузский район	Каратузская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов	Современный взгляд на старинный обряд	4
106.	Здоровая семья – здоровый край	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация «Центр детского досуга «Олимпия»	Особые дети - особые семьи	4
107.	Экологическое партнерство	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА»	Эко-Эхо	4
108.	Доброе сердце	IV группа	Минусинский район	Местная Общественная Молодежная Организация содействия решению социальных проблем «Добровольное Объединение Молодежи» Минусинского района	Семейный игровой уголок «БИБЛИОШКА»	4

109.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Некоммерческое партнерство «Красноярский Центр Иппотерапии»	Тропа доверия	3
110.	Здоровая семья – здоровый край	II группа	Манский район	Местная детская общественная организация свободного творчества Манского района «Манская юность»	Счастливые семейные лыжи	3
111.	Экологическое партнерство	г. Красноярск	г. Красноярск	Некоммерческое партнерство «Красноярский Центр Иппотерапии»	Познание начинается с удивления	3
112.	Защищенное детство	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»	Комплексная программа по профилактике деликвентного поведения несовершеннолетних находящихся в группе риска «Выход из лабиринта»	3
113.	Социальная поддержка	II группа	Ужурский район	Ужурская районная местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	Вместе мы можем ВСЕ! - спортивная площадка для занятий адаптивной физической культурой в городе Ужуре	3
114.	Социальная поддержка	IV группа	Курагинский район	Красноярская региональная общественная организация поддержки многодетных семей «Новый день»	Связующая нас нить	3
115.	Экологическое партнерство	г. Красноярск	г. Красноярск	Некоммерческая организация Экологический Фонд «Березовая роща»	Воспитание экологической культуры и экологической грамотности населения различных возрастных категорий посредством проведения культурно-просветительских мероприятий	3
116.	Астафьевское наследие	I группа	Рыбинский район	Региональная молодежная общественная организация программ общественного развития Красноярского края «Зеленый остров»	Тростевой кукольный театр «Лучик»	3

117.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская Региональная общественная организация «Творческое содружество «Босые души»	Живые струны души	2
118.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация содействия предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями «Подари улыбку»	«Здоровое долголетие- Образовательно-оздоровительная программа для пожилых»	2
119.	Социальная поддержка	VI группа	г. Норильск	Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица»	Смакуй!	2
120.	Здоровая семья – здоровый край	г. Красноярск	г. Красноярск	Некоммерческая организация детский благотворительный фонд «Живое дыхание»	Команда инклюзивных побед	2
121.	Доброе сердце	IV группа	Каратузский район	Каратузская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов	Память поколений от сердца к сердцу	2
122.	Гражданское общество и библиотека	VII группа	Иланский район	Благотворительный фонд местного сообщества Иланского района «Благо Дарю»	Библио Time	1
123.	Экологическое партнерство	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная молодежная экологическая организация	Великий зелёный поход... начни с себя!	1
124.	Социальная поддержка	V группа	Богучанский район	Местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) Богучанского района	Фотостудия «Старость - в радость»	1
125.	Социальная поддержка	I группа	г. Железногорск	Автономная некоммерческая организация «Железногорский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых»	Оказание паллиативной помощи на дому	1
126.	Социальная поддержка	VII группа	Богучанский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Богучанского района	Активно жить - здоровым быть!	1

127.	Социальная поддержка	III группа	г. Назарово	Некоммерческое партнерство «Агентство поддержки медицинских учреждений»	Мобильная швейная мастерская #Ниточка иголочка	1
128.	Доброе сердце	II группа	п. Кедровый	Красноярская региональная общественная организация возрождение духовности и культуры «МАМА»	Жить Легко	1
129.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Некоммерческое партнерство «Красноярский Центр Иппотерапии»	Где воля - там и победа	1
130.	Живая память	VII группа	Иланский район	Благотворительный фонд местного сообщества Иланского района «Благо Дарю»	История и поколения	1
131.	Я люблю русский язык	II группа	Ужурский район	Ужурская районная местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	Чисто по-русски	1
132.	Гражданское общество и библиотека	VII группа	Дзержинский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинского района	Самородок Сибири	0
133.	Здоровая семья – здоровый край	VI группа	г. Норильск	Благотворительный фонд «69 параллель»	Жизнь с плюсом	0
134.	Защищенное детство	VII группа	Иланский район	Иланская местная женская общественная организация «Согласие»	Без громких слов	0
135.	Красноярская идентичность	VI группа	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район	Местная общественная организация «Союз Нганасан» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района	Священная рыба Сакана	0
136.	Красноярская идентичность	VII группа	Дзержинский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинского района	Диалог поколений	0

137.	Красноярская идентичность	V группа	г. Енисейск	Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития народного творчества и духовности»	Интеллектуальные игры по краеведению Енисейск 400	0
138.	Здоровая семья – здоровый край	VII группа	Дзержинский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинского района	Универсиаде 2019 быть!»	0
139.	Здоровая семья – здоровый край	V группа	Богучанский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Богучанского района	ХоббиЛенд	0
140.	Социальная поддержка	V группа	Кежемский район	Автономная некоммерческая организация «ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»	Лето в развитии	0
141.	Защищенное детство	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области культуры «Альтернатива»	Технопарк «Лабиринт безопасности»	0
142.	Здоровая семья – здоровый край	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация по защите прав и интересов детей «ГОРОД ДЕТСТВА»	Детский карнавал	0
143.	Соседское сообщество	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация содействия благоустройству городов «Чистоград»	Собачий вопрос	0
144.	Защищенное детство	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «ВЕРБА»	Ребенок в центре внимания	0
145.	Защищенное детство	V группа	Богучанский район	Фонд Содействия и развития «Футбольно-хоккейного клуба «Ангара»	Спортивное наставничество	0
146.	Красноярская идентичность	г. Красноярск	г. Красноярск	Автономная некоммерческая организация Агентство творческих индустрий «Креативный город»	Широко закрытыми глазами	0

147.	Здоровая семья – здоровый край	I группа	г. Железногорск	Красноярская региональная молодежная общественная организация «Федерация Здорового Образа Жизни»	Научись спасать жизнь!	0
148.	Социальная поддержка	VI группа	г. Норильск	Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица»	Полярный совёнок	0
149.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация свободного творчества «АЭРОСТАТ»	Отдых без родителей	0
150.	Красноярская идентичность	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация содействия развитию кадетского и Мариинского движения «Северный крест»	Искусство открывает Антарктиду	0
151.	Красноярская идентичность	VI группа	Эвенкийский муниципальный район	Красноярская региональная общественная организация социальной поддержки «Сила Эвенкии»	Стрелок	0
152.	Красноярская идентичность	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация по защите прав и интересов детей «ГОРОД ДЕТСТВА»	Город глазами художника	0
153.	Здоровая семья – здоровый край	г. Красноярск	г. Красноярск	Молодёжная оборонная спортивно-техническая региональная общественная организация «Патриот» Красноярского края	Дети и их родители	0
154.	Социальная поддержка	г. Красноярск	г. Красноярск	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации»	Создание инфраструктуры поддержки детям с ментальными нарушениями и их семьям	0
155.	Экологическое партнерство	V группа	Абанский район	Благотворительный фонд социальной поддержки Абанского района	Эко-десант	0

156.	Экологическое партнерство	III группа	г. Назарово	Красноярская региональная экологическая общественная организация «Ноосфера»	Система общественного контроля качества питьевой воды на территории городского округа Назарово	0
157.	Астафьевское наследие	I группа	г. Бородино	Красноярская библиотечная ассоциация	Деревья растут для всех	0
158.	Гражданское общество и библиотека	IV группа	Курагинский район	Красноярская региональная общественная организация поддержки многодетных семей «Новый день»	Игра в Жизнь	0
159.	Соседское сообщество	IV группа	Каратузский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Каратузского района	Нескучные выходные	0
160.	Я люблю русский язык	V группа	Богучанский район	Фонд развития Богучанского района «За нами будущее»	Веселая АБВГДЕЙКа	0
161.	Советы ветеранов	VII группа	г. Канск	Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Канска	Сказка потомкам	0
162.	Гражданское общество и библиотека	IV группа	Каратузский район	Каратузская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов	Библиотека - теплый дом	0
163.	Экологическое партнерство	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация «Красноярский краевой клуб спелеологов»	Сохранить и приумножить!	0
164.	Доброе сердце	IV группа	Каратузский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Каратузского района	И стар и млад - спорту рад	0
165.	Доброе сердце	V группа	Кежемский район	Автономная некоммерческая организация «ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»	Дружба поколений	0

166.	Соседское сообщество	II группа	Балахтинский район	Местный общественный фонд Балахтинского района поддержки социально значимых проектов «Партнер»	Строительство детской площадки «Цветик-семицветик»	0
167.	Астафьевское наследие	IV группа	Каратузский район	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Каратузского района	Живая дорога писателя	0
168.	Соседское сообщество	IV группа	Каратузский район	Каратузская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов	ДоброДар	0
169.	Экологическое партнерство	г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская региональная общественная организация «Красноярский краевой клуб спелеологов»	Лес вокруг города	0

Приложение №4

Список 56 проектов – победителей, отобранных для мониторинга посредством выезда в территории их реализации

№	Территория	Населенный пункт	Название проекта	Заявитель	Номинация	Руководитель проекта	Телефон	Эл. почта
1.	г. Красноярск	г. Красноярск	Собачий вопрос	Автономная некоммерческая организация содействия благоустройству городов «Чистоград»	Соседское сообщество	Чинякова Ольга Николаевна	7(923)354-5765	rostok-life@mail.ru
2.	г. Красноярск	г. Красноярск	Перекресток историй	Автономная некоммерческая организация развития прикладного творчества, добровольчества и гармоничной семьи «Мастерская Добра»	Красноярская идентичность	Переломова Евгения Геннадьевна	7(913)598-9227	evg-perelomova@yandex.ru
3.	г. Красноярск	г. Красноярск	Свобода. Трезвый путь	Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей»»	Социальная поддержка	Ольшанский Дмитрий Владимирович	7(902)920-8800	eniseyrc@yandex.ru
4.	г. Красноярск	г. Красноярск	Информационная система учёта городских зеленых насаждений «Посчитай меня!»	Красноярская региональная общественная организация по развитию городской среды «Живой город»	Экологическое партнерство	Заступенко Анастасия Николаевна	7(903)922-2039	leommaann@yandex.ru
5.	г. Красноярск	г. Красноярск	Детский карнавал	Красноярская местная общественная организация содействия молодежным и творческим инициативам «Город молодых»	Здоровая семья – здоровый край	Тетерина Светлана	7(902)940-7209	tgd23@mail.ru
6.	г. Красноярск	г. Красноярск	Секреты молока	Красноярская региональная общественная организация содействия развитию птицеводства и животноводства «Сибирское подворье»	Красноярская идентичность	Шубкина Татьяна	7(913)535-2643	t_shubkina@mail.ru
7.	г. Красноярск	г. Красноярск	Общение без границ	Красноярская местная общественная организация «Кыргызская национально-культурная автономия»	Согласие	Батаева Назгуль Жанышбековна	7(913)534-4433	Nka24@list.ru
8.	г. Красноярск	г. Красноярск	Дети и их родители	Молодёжная оборонная спортивно-техническая региональная общественная организация «Патриот» Красноярского края	Здоровая семья – здоровый край	Калугин Олег Геннадьевич	7(908)212-6744	rffk@yandex.ru
9.	г. Красноярск	г. Красноярск	Сохранить и приумножить!	Красноярская региональная общественная организация «Красноярский краевой клуб спелеологов»	Экологическое партнерство	Старикова Марина Геннадьевна	7(983)166-5717	rednost@list.ru
10.	г. Красноярск	г. Красноярск	«Здоровое долголетие-образовательно-оздоровительная программа для пожилых»	Красноярская региональная общественная организация содействия предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями «Подари улыбку»	Социальная поддержка	Николаенко Сергей Алексеевич	7(839)127-6659	mail@zubnik32.rum
11.	г. Красноярск	г. Красноярск	Отдых без родителей	Красноярская региональная общественная организация свободного творчества «АЭРОСТАТ»	Социальная поддержка	Мезенцев Владимир Александрович	7(923)284-5496	bolsunovskayan@gmail.com

12.	г. Красноярск	г. Красноярск	Третий сектор. Четвертая власть. Укрепление партнерских отношений	Ассоциация телевещателей и телепроизводителей Красноярского края «Енисей ТВ»	Красноярская идентичность	Злобина Елена Владимировна	7(983)143-5111	zlobinaenisey@gmail.com
13.	г. Красноярск	г. Красноярск	Центр социальной адаптации трудовых мигрантов	Региональная ассоциация социальной поддержки «ОПОРА»	Согласие	Сорокина Наталья	7(903)923-1758	sorokina.ns@mmcentre24.ru
14.	г. Красноярск	г. Красноярск	Комплексная программа по профилактике деликвентного поведения	Красноярское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»	Защищенное детство	Спирина Наталья Михайловна	7(391)212-2639	detfond_spirina@mail.ru
15.	г. Красноярск	г. Красноярск	Познание начинается с удивления	Некоммерческое партнерство «Красноярский центр иппотерапии»	Экологическое партнерство	Шиенок Владимир Алексеевич	7(902)940-5689	krasssp@mail.ru
16.	г. Красноярск	г. Красноярск	Третье место	Автономная некоммерческая организация «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего»	Защищенное детство	Турушев Максим Иннокентьевич	7(923)339-1001	Mturushev@yandex.ru
17.	г. Красноярск	г. Красноярск	Обучение волонтеров Зимней универсиады – 2019 навыкам жестовой речи.	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации»	Наша Универсиада	Шурдукалов Владимир Никанорович	7(913)518-6911	AnitaT@yandex.ru
18.	г. Красноярск	г. Красноярск	МедиаПарк НКО	Автономная некоммерческая организация Межрегиональный ресурсный центр медиа-грамотности и информационного сопровождения «МЕДИАЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»	Социальная поддержка	Замышляева Ирина	7(902)960-5359	media-irina24@yandex.ru
19.	г. Красноярск	г. Красноярск	Форум-театр Шаг навстречу	Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА»	Согласие	Анастасия Мокрушина	7(929)320-4403	ana.mokrushina@gmail.com
20.	г. Красноярск	г. Красноярск	Доступная занятость	Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере социальной поддержки лиц с расстройствами аутистического спектра и их семей «Социальная усадьба «Добрая»	Социальная поддержка	Маркевич Анна Николаевна	7(902)965-5050	autismhelp@mail.ru
21.	г. Красноярск	г. Красноярск	Подростковый суицид: внедрение программы профилактики в школах	Красноярская региональная общественная организация «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «ВЕРБА»	Защищенное детство	Пальчик Наталья Борисовна	7(391)231-4847	centerverba@mail.ru
22.	г. Красноярск	г. Красноярск	Особые дети - особые семьи	Автономная некоммерческая организация «Центр детского досуга «Олимпия»	Здоровая семья – здоровый край	Пуштареева Фания Алмазовна	7(908)220-1676	tiermis@yandex.ru
23.	г. Красноярск	г. Красноярск	Заманье – центр экологического туризма и краеведения	Фонд поддержки социально-экономического развития «РОСТ»	Экологическое партнерство	Сиротинин Александр Сергеевич	7(391)295-0919	ulyana_chaykina@mail.ru

24.	г. Красноярск	г. Красноярск	Путёвка в жизнь через кадетство	Красноярская региональная общественная организация содействия развитию кадетского и Мариинского движения «Северный крест»	Здоровая семья - здоровый край	Захаров Игорь Евгеньевич	7(391)251-2496	info@skrest.ru
25.	г. Красноярск	г. Красноярск	Образовательная программа «Первый молодёжный экологический штаб»	Благотворительный фонд «Принеси пользу»	Экологическое партнерство	Исаева Алла Борисовна	7(913)181-7050	prinesi@inbox.ru
26.	г. Красноярск	г. Красноярск	Великий зелёный поход... начни с себя!	Красноярская региональная общественная молодёжная экологическая организация «Зелёный кошелёк»	Экологическое партнерство	Спожакина Татьяна Васильевна	7(923)304-8211	vedotr@mail.ru
27.	г. Красноярск	г. Красноярск	Социально-государственное партнерство, как эффективный путь повышения качества атмосферного воздуха	Красноярская региональная общественная организация «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ И СВОБОДНЫЙ ОТ КОРРУПЦИИ КРАЙ»	Экологическое партнерство	Гудовский Павел Геннадьевич	7(905)976-1346	ookrkr@mail.ru
28.	г. Красноярск	г. Красноярск	Экологический патруль	Местная общественная организация «Красноярский городской клуб спелеологов»	Экологическое партнерство	Бурмак Игорь Николаевич	7(950)403-6301	speleoclub24@mail.ru
29.	г. Красноярск	г. Красноярск	Технопарк «Лабиринт безопасности»	Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области культуры «Альтернатива»	Защищенное детство	Кудрявцев Дмитрий Владимирович	7(913)557-1712	alter2.0@yandex.ru
30.	г. Красноярск	г. Красноярск	СемьяФест	Красноярская региональная детско-молодежная общественная организация «Ассоциация любителей видео»	Здоровая семья – здоровый край	Федяева Галина Викторовна	7(913)509-8303	pozolotina2003@gmail.com
31.	г. Красноярск	г. Красноярск	Солнечная семья выбирает спорт!	Красноярская региональная общественная организация родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна и детей с другими наследственными заболеваниями «Солнце в наших сердцах»	Здоровая семья – здоровый край	Жилякова Оксана Александровна	7(923)272-1888	sunkrsk@mail.ru
32.	г. Красноярск	г. Красноярск	«Центр сохранения природного и культурного наследия восточного сектора Арктики - «Мыс Зверобой - зимовье Громадское»	Красноярская региональная общественная экологическая организация «Природа Сибири»	Экологическое партнерство	Чапалов Игорь Геннадьевич	7(933)335-6925	igor.chapalov@yandex.ru
33.	Курагинский р-н	деревня Гуляевка	Игра в Жизнь	Красноярская региональная общественная организация поддержки многодетных семей «Новый день»	Гражданское общество и библиотека	Ислентьева Надежда Николаевна	7(908)012-2369	sibnad@bk.ru
34.	Ужурский р-н	г.Ужур	Вместе мы можем ВСЕ! - спортивная площадка для занятий адаптивной физической культурой в городе Ужуре	Ужурская районная местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	Социальная поддержка	Логонова Людмила Михайловна	7(950)406-3712	loginova65g@mail.ru

35.	Шушенский р-н	пгт.Шушенское	Эквитерра: Тропа к здоровью	Красноярское региональное экологическое общественное движение в поддержку особо охраняемых природных территорий, образования и культуры «Равновесие»	Здоровая семья – здоровый край	Кувардина Софья Евгеньевна	7(953)588-9609	svietlana_glyzina@mail.ru
36.	Каратузский р-н	д.Лебедевка	И стар и млад - спорту рад	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Каратузского района	Доброе сердце	Костюченко Надежда Тихоновна	7(391)372-2794	karatuzsputnik@gmail.com
37.	г. Ачинск	г. Ачинск	Почти как иностранцы в России	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья «Легкий шаг»	Социальная поддержка	Соколова Наталья Дмитриевна	7(960)768-9170	sokolova_i_koni@mail.ru
38.	Богучанский р-н	п.Манзя	Активно жить - здоровым быть!	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Богучанского района	Социальная поддержка	Мудрак Татьяна Владимировна 89509991897 тер координатор	Бордакова Валентина Егоровна 7(983)149-2989	manzy_ss@mail.ru
39.	Богучанский р-н	с.Богучаны, п.Гремучий, п.Невонка	Спортивное наставничество	Фонд Содействия и развития «Футбольно-хоккейного клуба «Ангара»	Защищенное детство	Мудрак Татьяна Владимировна 89509991897 тер координатор	Рукосуев Сергей Николаевич 7(908)221-3836	rukosuev-bog@mail.ru
40.	г. Норильск	г. Норильск	Смакуй!	Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица»	Социальная поддержка	Хубецова Ирина Николаевна	7(913)531-0409	ierehon@yandex.ru
41.	г. Железногорск	г. Железногорск	Оказание паллиативной помощи на дому	Автономная некоммерческая организация «Железногорский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых»	Социальная поддержка	Стародубцев Виктор Васильевич, 7(983) 150-0304	Заместитель (брат) Анатолий Васильевич 89504203001	svv260@mail.ru
42.	Краснотуранский р-н	с.Кортуз	ЭКОлёнок!	Местная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив Краснотуранского района «Перспектива»	Гражданское общество	Екатерина Макарова	7(792)337-8501	ekaterina.bogdan.1627@yandex.ru
43.	г. Боготол	г. Боготол	Боготольские кружева	Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола	Красноярская идентичность	Галина Валерьевна	7(963)265-0506	galinarahalina@mail.ru
44.	Боготольский р-н	с. Юрьевка	Красота и уют все село соберут	Боготольская местная молодежная общественная организация поддержки общественных инициатив «По зову сердца»	Соседское сообщество	Прикатова Наталья Викторовна	7(960)769-1708	pozovu_serdca@mail.ru
45.	Назаровский р-н	с.Кольцово Степновского сельсовета	Создание «Центра развития и творчества»	Местная общественная организация по социальному развитию «Созидание» Назаровского района Красноярского края	Защищенное детство	Шипило Людмила Николаевна	7(391)555-4560	nazbiblioteka@list.ru
46.	г. Норильск	г. Норильск	Полярный совёнок	Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица»	Социальная поддержка	Хубецова Ирина Николаевна	7(391)938-8634	ierehon@yandex.ru
47.	г. Железногорск	г. Железногорск	Научись спасать жизнь!	Красноярская региональная молодежная общественная организация «Федерация Здорового Образа Жизни»	Здоровая семья – здоровый край	Колбацких Валерий Валерьевич	7(904)896-2424	fed-zozh@yandex.ru
48.	г. Дивногорск	г. Дивногорск	Эко-тропа «Лес LTS»	Красноярская региональная молодежная общественная организация по реализации молодежных программ и проектов «Дека» (Дивногорская единая команда актива)	Экологическое партнерство	Верхотуров Илья Валерьевич	7(913)832-4147	Bratan91678@yandex.ru

49.	г. Железногорск	г. Железногорск	НАСТОЯЩИЕ	Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края	Здоровая семья – здоровый край	Блинникова Марина Александровна	7(913)199-0450	shorcentr10@gmail.com
50.	Боготольский р-н	с. Большая Косуль	#ТанцПлощадка	Местная общественная организация Боготольского района «Туристический клуб БАТЫР»	Соседское сообщество	Корбут Ольга Николаевна	7(933)327-6491	m.familia2016@yandex.ru
51.	г. Дивногорск	г. Дивногорск	МАКСИ	Красноярская региональная молодежная общественная организация по реализации молодежных программ и проектов «Дека» (Дивногорская единая команда актива)	Здоровая семья – здоровый край	Верхотуров Илья Валерьевич	7(913)832-4147	Go.Deka2015@mail.ru
52.	г. Канск	г. Канск	Зрелое родительство	Автономная некоммерческая организация поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Спектр»	Социальная поддержка	Скаредина Елена Владимировна	7(913)550-7954	elena.skaredina@mail.ru
53.	Иланский р-н	г. Иланский	История одного города	Благотворительный фонд местного сообщества Иланского района «Благо Дарю»	Доброе сердце	Турейко Татьяна Васильевна	7(962)067-8823	tureyko@list.ru
54.	Иланский р-н	д. Южно Александровка	Малиновские напевы	Иланская местная женская общественная организация «Согласие»	Красноярская идентичность	Панкова Виталия Николаевна	7(963)261-2400	mvc.ilanskiy@mail.ru
55.	Кежемский р-н	г.Кодинск	Тутти	Автономная некоммерческая организация «ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»	Социальная поддержка	Измайлов Алексей Николаевич	7(903)920-1345	izmaylov_aleksey@mail.ru
56.	Шушенский р-н	пгт.Шушенское	Перекресток	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Шушенского района	Социальная поддержка	Шумаева Наталья Николаевна	7(908)325-8210	shveter@gmail.com

Приложение №5

Рейтинг 56 проектов по итогам мониторинга эффективности реализации социальных проектов в территориях края, посредством выезда в территории их реализации

Группа районов	Территории	Номинация	Полное наименование некоммерческой организации	Название проекта	Комментарии эксперта	общий балл
г. Красноярск	г. Красноярск	Здоровая семья – здоровый край	Красноярская региональная детско-молодежная общественная организация «Ассоциация любителей видео»	СемьяФест	Все показатели соответствуют заявленным. Социальная эффективность в запланированных масштабах достигнута, при этом проблематика выбранной темы одним проектом не решится. Было привлечено много партнеров и волонтеров, в т.ч. потому что финансовых ресурсов для реализации такого проекта оказалось недостаточно	40
г. Красноярск	г. Красноярск	Соседское сообщество	Автономная некоммерческая организация содействия благоустройству городов «Чистоград»	Собачий вопрос	На момент проведения проверки, проект реализован на 100%, сроки мероприятий не переносились. В целом проект востребован целевой аудиторией. Нет сомнений, что проект будет развиваться и тиражироваться, возможен в будущем коммерческий аспект. Создана группа проекта, отмечен положительный общественный резонанс, интерес СМИ к проекту.	40
I группа	г. Железногорск	Здоровая семья – здоровый край	Региональная общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края	НАСТОЯЩИЕ	Фактические показатели соответствуют плановым. По итогам проекта были созданы условия для психологической поддержки неполных семей в ЗАТО Железногорск (200 мам и сыновей) за счет участия в регулярных спортивных, развивающих, творческих и иных мероприятиях проекта. Что позволило мамам повысить свою компетентность в вопросах воспитания подрастающих мальчиков, решить внутрисемейные проблемы в общении и понимании, организовать совместный досуг, интересный мальчикам и под руководством специалистов. Подобный комплексный подход в г. Железногорске не представлен, даже как платная услуга. В группе проекта в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/nastoyashie_projekt) 219 участников группы, при этом можно отметить высокую активность участников – они комментируют новости и фото, пресс- и постерелизы, оставляют отзывы о мероприятиях (по 10 и более комментариев).	40
III группа	Боготольский район	Соседское сообщество	Местная общественная организация Боготольского района «Туристический клуб БАТЫР»	#ТанцПлощадка	Из содержательного отчета следует, что все запланированные мероприятия были проведены в полном объеме и с достижением количественных показателей, создан разновозрастной отряд волонтеров в количестве 40 человек (но не были представлены договоры с волонтерами). Проведено 7 мероприятий с участием не менее 400 человек. По итогам анкетирования руководителя, публичной отчетности по факту реализации проекта, общения с партнерами и благополучателями можно сделать вывод об успешной реализации проекта. Все заявленные показатели выполнены на момент мониторинга на 100%. Руководитель организации легко шел на контакт, организовал все встречи, подготовил документы. По итогу реализации проекта можно сделать вывод о том, что в с. Большая Косуль местное сообщество было вовлечено в работу по преобразованию пространства, общими усилиями была реконструирована и облагорожена танцевальная площадка, вновь запущены танцевальные вечера под открытым небом и иные мероприятия. Можно также отметить, что по итогу реализации проекта была создана группа сельских активистов, которые решили продолжить деятельность по благоустройству своего села.	40

					<p>В ходе мониторинга была организована встреча с партнером – руководителем СДК, который отметил высокую социальную важность реализации проекта в данном населенном пункте, так как эта площадка в летний и осенний период стала местом притяжения для жителей разного возраста и позволяет включаться в активную культурную жизнь поселения. Также в ходе беседы с представителем волонтерской группы им было отмечено, что вовлечение молодежи в реализацию проекта положительно сказалось на социальной активности молодежи, позволило им принять активное участие в создании комфортной среды в поселке, включиться в организацию мероприятий и принять в них участие, что немаловажно для данной территории – так как мест досуга здесь немного. Проект освещается в социальных сетях: группа организации в социальной сети ВКонтакте (vk.com/public165916973) – 5 публикаций о проекте с упоминанием грантовой программы, в группе более 90 участников; группа в социальной сети Одноклассники (ok.ru/kulturabo)..</p>	
I группа	г. Дивногорск	Экологическое партнерство	Красноярская региональная молодежная общественная организация по реализации молодежных программ и проектов «Дека» (Дивногорская единая команда актива)	Эко-тропа «Лес LTS»	<p>В ходе мониторинга были предоставлены все содержательные документы о реализации проекта: аналитическая справка об итогах реализации проекта, положение о проведении экологической экспедиции, фотобанк со всех мероприятий, договор с лесхозом на проведение работ в лесной зоне, макеты баннеров и щитов, протоколы исследований молодежной экспедиции, протокол собрания актива НКО, списки участников. По предоставленным документам, а также в ходе выезда на место реализации проекта можно сделать вывод о проведении всех запланированных мероприятий в полном объеме и достижении всех показателей. На сегодняшний момент экологическая тропа стала популярным местом отдыха горожан, образовательной площадкой для студентов техникума лесных технологий. Деятельность по проекту позволила апробировать новые форматы экологического воспитания молодежи и вовлечения их в общественную деятельность, создать современные эко-площадки для досуга и отдыха. Дальнейшее развитие проекта предполагается за счет увеличения длительности тропы, создания экологических патрулей в образовательных учреждениях города, организовать экологическую практику школьников. Актуальность и нужность проекта на территории г. Дивногорска подтверждается активным включением партнеров и горожан. Информация о реализации проекта размещена в группе в социальной сети ВКонтакте, проект известен и узнаваем в территории</p>	40
г. Красноярск	г. Красноярск	Экологическое партнерство	Красноярская региональная общественная организация по развитию городской среды «Живой город»	Информационная система учёта городских зеленых насаждений «Посчитай меня!»	<p>По итогам анкетирования руководителя, публичной отчетности по факту реализации проекта, проверки отчетов можно сделать вывод об успешной реализации проекта. В ходе реализации проекта была создана действующая комплексная информационная система с мобильной формой ввода и платформой для хранения, анализа и выдачи данных countree.ru, в нее интегрирован электронный каталог с 32-мя (изначально заявлено 30) наиболее распространенными видами и инструкция по определению их состояния, типа кроны, условий. За время проекта была произведена инвентаризация зеленых насаждений и созданы карты на территории трех городов: Красноярск, Минусинск, Назарово с подробным описанием зеленых насаждений и их состояния (более 18 тысяч деревьев), подготовлено 32 волонтера из 30 заявленных в проекте. В ходе проекта были созданы условия для обеспечения жителей трех городов Красноярского края объективной информацией о состоянии зеленого фонда на определенных участках, привлечено внимание общественности и власти к проблемам зеленых насаждений. Из незапланированных результатов также можно отметить привлечение волонтерами к своей деятельности волонтеров и распространение итогов проекта на таких крупных городских площадках как: Гражданская ассамблея, Городской форум, а также конференция в г. Новосибирске. В интернете размещено много материалов, есть группа в соц. сетях. участие в проекте также освещают партнеры</p>	40

IV группа	Шушенский район	Социальная поддержка	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Шушенского района	Перекресток	Партнеров проекта стало больше, чем планировалось. Клуб очень востребованное место для жителей старшего возраста пос. Шушенское. Поддерживает администрация Шушенского района, привлекались к ремонту помещения студенты техникума. Собственных информ. ресурсов нет, публикации были на эл. площадках администрации и библиотеки	39
г. Красноярск	г. Красноярск	Защищенное детство	Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области культуры «Альтернатива»	Технопарк «Лабиринт безопасности»	Все плановые показатели соответствуют заявленным. целевая аудитория отзывалась положительно, поступило много заявок на проведение совместных мероприятий. Хорошая поддержка бизнеса. Информировали ЦА напрямую, приглашали. Есть сайт, ссылок на соц сети не представлено.	39
г. Красноярск	г. Красноярск	Социальная поддержка	Автономная некоммерческая организация Межрегиональный ресурсный центр медиа-грамотности и информационного сопровождения «МЕДИА-ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»	МедиаПарк НКО	В Агентство на согласование направлены письма по изменениям в проекте: по изменению сроков мероприятий проекта, по изменению состава проекта. Проект является актуальным, социально значимым для территории, что подтверждается анкетами благополучателей и партнеров проекта. Реализация проекта подробно освещалась на интернет ресурсах.	39
г. Красноярск	г. Красноярск	Защищенное детство	Автономная некоммерческая организация «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего»	Третье место	Проект является актуальным, социально значимым, особенно для Октябрьского района города Красноярска, что подтверждается анкетами благополучателей. В рамках информационной компании проекта было запланировано размещение информации о реализации проекта на сайте http://24fe.ru/ и в группе организации в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/labeng . Однако, на данных ресурсах есть только информация о проекте, поддержанном Фондом президентских грантов, о поддержке в рамках конкурса «Партнерство» информации нет.	39
г. Красноярск	г. Красноярск	Социальная поддержка	Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей»	Свобода. Трезвый путь	На момент проведения выездной проверки, проект реализован на 80%. Количественные и качественные показатели по проекту выполнены. И партнёрами и благополучателями отмечена важность проекта, его социальная значимость, эффективность программы и низкий процент рецидива среди прошедших реабилитацию. Высокий уровень устойчивой ремиссии является показателем результативности проекта. Все партнеры гарантировали участие в мероприятиях проекта или помощь в привлечении целевой аудитории и пропаганде ЗОЖ. По факту мероприятия проекта реализовывал РЦ «Енисей», т.е. партнерскими этими отношения назвать нельзя. Не все партнеры стали участниками проекта или их вклад, или участие не отражены в документации о проекте. публикаций много	39

г. Красноярск	г. Красноярск	Защищенное детство	Красноярская региональная общественная организация «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «ВЕРБА»	Подростковый суицид: внедрение программы профилактики в школах	<p>В ходе мониторинга были представлены все содержательные отчетные документы: фотобанк, списки участников семинаров, журнал учета индивидуальных и семейных консультаций, списки участников подростковых психотерапевтических групп, макет игрового методического пособия «Семейный квест», макет памятки для подростка, отзывы благополучателей с мероприятий. Замечаний по представленным документам нет. Считаю, что мероприятия проекта полностью выполнены и это подтверждено документально. Все мероприятия проходят в соответствии с графиком. Памятки для подростков изготовлены позже предполагаемого срока в связи с более длительным согласованием содержания буклета с партнерами, а также двойным тестированием буклетов на подростках с целью выяснения какой текст им более доступен/понятен. Изначально планировалось провести эту работу летом, но в итоге она была перенесена на осень. По итогам анкетирования руководителя, публичной отчетности по факту реализации проекта, анкетирования партнеров и благополучателей можно сделать вывод об успешной реализации проекта и апробировании технологии работы не только с непосредственной с целевой группой проекта (подростки группы риска и родители), но и школьные психологи, перед которыми стоят серьезные задачи по профилактике подростковых суицидов, но при этом они фактически не имеют инструментария. Проект предлагает им эффективную методику «семейного» квеста в виде упакованной коробки с комплектом пояснений, что фактически упрощает для них задачу и упрощает внедрение и использование методики.</p>	38
					<p>Проект очень важен и нужен не только на территории Красноярского края. Современная и интересная подросткам «упаковка» методики в формате квест-игры позволяет сделать вывод о том, что данный формат увеличит эффективность профилактической работы школьных психологов в данной теме, а также повысить свой профессиональный уровень за счет участия в семинарах и тренингах. В ходе реализации проекта оборудование не приобреталось. За счет целевых средств был разработан и изготовлен сайт (https://centerverba.ru/). На момент мониторинга сайт успешно работает, на нем размещен логотип грантовой программы и публикуются новости о проекте. На главной странице сайта размещен телефон горячей линии в формате яркого баннера, а также есть ссылка на группу в социальной сети ВКонтакте, посвященную методике семейного квеста (https://vk.com/family_quest). В группе есть все методические материалы и видеогайды по игре, а также указаны контакты психологов и горячей линии. На момент мониторинга в группе 56 участников.</p>	

г. Красноярск	г. Красноярск	Здоровая семья – здоровый край	Автономная некоммерческая организация «Центр детского досуга «Олимпия»	Особые дети - особые семьи	По итогам общественной защиты, а можно мониторинга я могу сделать вывод об успешной реализации проекта. В процессе мониторинга руководитель организации легко шел на контакт с экспертом, предоставлял все запрашиваемые документы, организовал допуск на мероприятие и контакты с партнерами и целевой группой. По итогам презентации, анкетирования руководителя и мониторинга в целом можно сказать о том, что на данный момент плановые показатели проекта выполнены/завершены на 90% (по проведению мероприятий, количеству ЦА и расходам). В ходе реализации проекта я увидела затруднение в вовлечении неполных семей (из заявленных 10 в проект были привлечены только Считаю, что эта технология была успешно применена в работе со здоровыми детьми и детьми с ОВЗ, а также родителями. Родители в процессе мероприятий вовлечены в творческую деятельность совместно с детьми, что создает дополнительную возможность для взаимодействия внутри семьи. Здоровые дети и дети с ОВЗ включены в совместную творческую деятельность, учатся совместным коммуникациям и взаимодействию. За время реализации проекта были созданы условия для поддержки психологического здоровья семей с детьми с ОВЗ и здоровыми детьми, был проведен комплекс мероприятий по работе как с детьми, так и с родителями (психологические консультации, тренинги и т.д.), а также ряд совместных мероприятий (праздники, мастер-классы и т.д.). В анкетах и отзывах к мероприятиям родители отмечали несомненный положительный для них эффект проекта, приходили на мероприятия проекта неоднократно. Работа с партнерами успешно организована. Отмечена была и актуальность реализуемого проекта для микрорайона Покровский. В группе организации в социальной сети ВКонтакте подробно анонсируются и освещаются мероприятия по проекту (https://vk.com/prodlenka_olimpia), есть ссылки на грантовую программу (всего 9 публикаций, 943 участника группы).	38
VII группа	Иланский район	Красноярская идентичность	Иланская местная женская общественная организация «Согласие»	Малиновские напевы	В ходе реализации проекта плановые показатели соответствуют фактическим. Данный проект актуальный для территории, получил значительную поддержку жителей села и близлежащих территорий, что может говорить о значительно высокой социальной эффективности проекта.	37
VI группа	г. Норильск	Социальная поддержка	Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лестница»	Смакуй!	По опросу - целевая группа оценивает проект высоко. Услуги, предлагаемые в проекте актуальны и очень востребованы. Оборудование, приобретенное на средства гранта продолжить работать на его развитие, т.к. заведенная услуга социализации наркозависимых актуальна и будет продолжаться оказываться и после реализации проекта. В проекте были указаны партнеры, но по факту проверки не оказалось анкет, не было возможности переговорить с партнерами. Вклад - подтвержден. На сайте Фонда и группе ВК информация о ходе реализации проекта крайне мало. Отзывов благополучателей о проекте в открытом пространстве нет. По поиску в Интернет информации о проекте очень мало. Узнаваемость проекта в территории его реализации только от целевой группы.	35
г. Красноярск	г. Красноярск	Согласие	Красноярская местная общественная организация «Кыргызская национально-культурная автономия»	Общение без границ	На момент мониторинга средства по проекты не были израсходованы полностью, в связи с тем что проект реализуется. Данный проекту востребован, о чем свидетельствует количество участников и их положительные отзывы в рамках встречи. Информационное сопровождение проекта велось в соответствии с договором, но проект плохо освещался в рамках самомониторинга.	35
III группа	г. Боготол	Красноярская идентичность	Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола	Боготольские кружева	Плановые показатели на срок проведения мониторинга практически достигнуты. Проект привлек интерес детей к историко-культурному наследию Боготола. Поисковые экспедиции для целевой аудитории стали востребованными среди целевой аудитории проекта.	35

IV группа	Шушенский район	Здоровая семья – здоровый край	Красноярское региональное экологическое общественное движение в поддержку особо охраняемых природных территорий, образования и культуры «Равновесие»	Эквитерра: Тропа к здоровью	В ходе защиты проекта, по договору № 16г были представлены: презентация (установленного образца), анкета руководителя, фотоматериал по проекту, аналитические, и финансовые документы. Основываясь на предоставленных данных, проект реализуется в соответствии с договором. Замечания по предоставленным финансовым документам отсутствуют. В рамках проекта была изменена сумма по статьям сметы (ст. 222, ст. 226). Данные изменения согласованы с грантодателем, у грантополучателя имеется письмо о уведомлении. Конечное письмо грантодателю направлено грантополучателем 01.12.2018 г. (приложено к данной карте мониторинга).Замечания по аналитическим документам:Самомониторинг в рамках реализации проекта, организация ведет.На 29.11.2018 год анкеты обратной связи с партнерами и благополучателями проекта организация, не предоставила.На основании вышесказанного, проект востребован, организация выполняет условия договора.	35
г. Красноярск	г. Красноярск	Социальная поддержка	Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере социальной поддержки лиц с расстройствами аутистического спектра и их семей «Социальная усадьба «Добрая»	Доступная занятость	на момент мониторинга проект находился в стадии реализации. Но есть отклонения по смете. Из 5 запланированных видов столярной деятельности освоено только 1. Есть опасения успеют ли до конца года освоить еще 4Технология «социальной усадьбы»; эффективна и востребована. Проект будет развиватьсяЕсть сайт с разделом о проекте. Но новостей мало. Та же ситуация в группе в ВК	35
г. Красноярск	г. Красноярск	Здоровая семья – здоровый край	Красноярская региональная общественная организация родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна и детей с другими наследственными заболеваниями «Солнце в наших сердцах»	Солнечная семья выбирает спорт!	количество благополучателей по юридическим консультациям не подтверждено. Были значительные изменения в смете, согласованные с агентствомЭффективность проекта низкая, мероприятия носят развлекательный характер, нет серьезного механизма для решения либо частичного решения указанной проблемы.не все мероприятия проекта хорошо освещались	35
г. Красноярск	г. Красноярск	Социальная поддержка	Красноярская региональная общественная организация содействия предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями «Подари улыбку»	«Здоровое долголетие- Образовательно-оздоровительная программа для пожилых»	На момент проведения мониторинга (из предоставленных материалов) организация уже достигла запланированные показатели по договору с грантодателем, до его окончания.	35

III группа	г. Боготол	Социальная поддержка	Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья «Легкий шаг»	Почти как иностранцы в России	В ходе защиты проекта, по договору № 12г были представлены: презентация (установленного образца), фотоматериал по проекту, аналитические, и финансовые документы. Основываясь на предоставленных документах возможно сделать вывод: По финансовым документам, замечаний к организации нет. По аналитическим документам: Не велась юридическая работа с добровольцами (договора, волонтерские книжки отсутствуют). В рамках реализации проекта команда столкнулась со следующими непредвидимыми проблемами: Вынужденная замена репертуара при подготовке творческих номеров. Ввод новых участников, необходимость индивидуальных репетиций выше запланированных. Замена технологии (механизма работы), проведения занятий по театральному мастерству с классической на адаптивную технологию, замена специалиста по проведению групповых и индивидуальных занятий. На момент мониторинга (со слов Соколовой Н.Д.) вышеуказанные проблемы находились на стадии разрешения, но привели к смещению сроков по организационному плану проекта. На момент проведения мониторинга организация не уведомила об этом грантодателя. Самомониторинг организация ведет не в полном объеме. Анкета руководитель проекта не предоставил	35
г. Красноярск	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район	Экологическое партнерство	Красноярская региональная общественная экологическая организация «Природа Сибири»	«Центр сохранения природного и культурного наследия восточного сектора Арктики - «Мыс Зверобой - зимовье Громадское»	Запланированные результаты по проекту не соответствуют результатам отраженным в договоре (место реализации проекта перенесено в пгт. Диксон). Данные изменения не согласованы с грантодателем. В рамках финансовых расходов у организации вышла экономия (произведен возврат).	35
г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская идентичность	Автономная некоммерческая организация развития прикладного творчества, добровольчества и гармоничной семьи «Мастерская Добра»	Перекресток историй	показатели достигаются планово И партнёрами и благополучателями отмечена важность проекта, его социальная значимость, интересные методы работы с детьми, отмечено что краеведческие проекты редко интересуют детей, данный проект интересен и полезен. Не все заявленные партнеры приняли участие Организация ведет очень качественную группу проекта в ВК https://vk.com/perekrestokistoriy .	35
II группа	г. Дивногорск	Здоровая семья – здоровый край	Красноярская региональная молодежная общественная организация по реализации молодежных программ и проектов «Дека» (Дивногорская единая команда актива)	МАКСИ	В договоре есть некоторое несоответствие. В п. 1.3 указаны в показателях 8 лекций, однако в орг. плане их нет. И они не проводились Создана инфраструктура, которой будет пользоваться целевая аудитория еще не один год Организация привлекла ресурсы и добровольцев и бюджета и бизнеса. Сложностью была задержка финансирования по договору гранта, но сроки удержаны. публикаций много, упоминания о ГП есть	35

VI группа	г. Норильск	Социальная поддержка	Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица»	Полярный совёнок	На момент мониторинга по проекту была зафиксирована сильная задержка сроков ремонта в одном из помещений фонда. Грантодатель не был уведомлен о данной ситуации, дополнительное соглашение отсутствует. Информация об открытии пространства «Полярный совёнок» разово появилась на сайте фонда «Лествица» - партнера проекта. И на сайте Храма Святой Троицы. В статьях указано, что данный проект реализуется за счет грантовых средств, полученных у компании Норникель. Информация о поддержке проекта средствами краевого гранта отсутствует.	34
VII группа	г. Канск	Социальная поддержка	Автономная некоммерческая организация поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Спектр»	Зрелое родительство	Не все содержательные документы были представлены, поэтому сложно сделать вывод о полном достижении результатов по охвату благополучателей и целевой аудитории. Проект нужный для территории. Благополучатели в 100% случаев отмечают положительную динамику. Слабая информационная открытость - мало информации в интернете. Но есть отзывы и включенность в самомониторинг	34
г. Красноярск	г. Красноярск	Экологическое партнерство	Красноярская региональная общественная организация «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ И СВОБОДНЫЙ ОТ КОРРУПЦИИ КРАЙ»	Социально-государственное партнерство, как эффективный путь повышения качества атмосферного воздуха	показатели по плану. Выбранная в проекте технология интересна и актуальна для города, но о ее эффективности можно будет судить только по итогам реализации проекта. На текущий момент для этого недостаточно данных. Ведется активное сотрудничество с органами власти, ВУЗами и др заинтересованными сторонами. Публикаций мало	34
III группа	Боготольский район	Соседское сообщество	Боготольская местная молодежная общественная организация поддержки общественных инициатив «По зову сердца»	Красота и уют все село соберут	Количественные и качественные показатели по проекту выполнены. Представители организации готовы к коммуникации, охотно отвечали на вопросы, предоставляли оригиналы документов. Данный проект является актуальным для территории, привлек интерес жителей села Юрьевка как детей, так и взрослых. Нет сомнений, что проект будет развиваться далее, как заявлено командой проекта, будут привлекаться новые ресурсы и силы.	34
г. Красноярск	г. Красноярск	Социальная поддержка	Красноярская региональная общественная организация свободного творчества «АЭРОСТАТ»	Отдых без родителей	При детальном изучении материалов проекта отмечено, что все содержательные документы о реализации данного проекта (папки с материалами проекта, отчеты, программы, фотографии, активные ссылки, информационные материалы, видеозаписи и пр.) соответствуют заявленным, подтверждают показатели. Списки представлены, иные отчеты представлены. Положительный эмоциональный фон отмечается при изучении видео, фото, отзывов в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/club57699400 . Несмотря на то, что письма партнеров не удалось увидеть, факт задержки финансирования по проекту убедил в том, что реализация проекта состоялась за счет партнерского вклада. Высокая информационная открытость.	34

г. Красноярск	г. Красноярск	Наша Универсиада	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации»	Обучение волонтеров Зимней универсиады – 2019 навыкам жестовой речи.	Произошли переносы сроков итогового мероприятия – флеш-моба из-за изменения места проведения. На момент мониторинга было определено место проведения – Педагогический университет, и дата проведения – 01.12.2018. Данные сроки выходят за сроки реализации по договору. Письмо на согласование переноса сроков мероприятия планировалось направить в Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития 19.11.2018. В бюджете проекта есть статья «приобретение лицензионных прав на программное обеспечение» для оборудования, которое сократили на Грантовом совете. Авторы приняли решение подготовить запрос в Агентство на перемещение суммы с данной статьи на иные расходы. Документально не подтверждено партнерство с заявленными организациями. В проекте были заявлены партнеры. Документально не подтверждено партнерство с заявленными организациями. Кабинет самомониторинга заполняется. Реализация проекта эпизодично освещалась на сайте организации. На иных ресурсах информацию найти не удалось.	33
г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская идентичность	Ассоциация телевещателей и телепроизводителей Красноярского края «Енисей ТВ»	Третий сектор. Четвертая власть. Укрепление партнерских отношений	Результаты проекта были в заявке заложены как создание условий, и осталось не понятным при экспертизе, конечный потребитель (муниципальные СОНКО) воспользовались ли обучением, изменили ли свою медийную политику, подобного анализа не представлено. Все запланированное - достигнуто. Условия созданы. Но на продолжение проекта каждый раз будут требоваться средства для проведения семинаров, т.е. на организацию процесса. Изначально, не было запланировано привлечение волонтеров. Не обнаружено документов, подтверждающих вклад из других источников по статье «Прочие услуги»; Информации о проекте достаточно в сети Интернет. Проект узнаваем.	33
г. Красноярск	г. Красноярск	Согласие	Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА»	Форум-театр Шаг навстречу	На момент мониторинга проект был реализован на 95%, но не было заключено 5 договоров с подрядчиками.	31
г. Красноярск	г. Красноярск	Согласие	Региональная ассоциация социальной поддержки «ОПОРА»	Центр социальной адаптации трудовых мигрантов	Показатели достигнуты. Проект эффективен, но реализован командой, состоящей из сотрудников федерального унитарного предприятия. Часть проектных форм соответствуют функционалу учреждения. Деятельность по проекту отражена на 2-х сайтах: организационно-заявителя и «Многофункционального миграционного центра»; но не ссылается на программу «Партнерство»;	30

г. Красноярск	г. Красноярск	Защищенное детство	Красноярское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»	Комплексная программа по профилактике деликвентного поведения	Представлены списки, фото мероприятий, подтверждающие планы и показатели. Проведено выборочное анкетирование 2 благополучателей (опрос). Участники проекта в целом удовлетворены результатами. На защите проекта команда проекта указала на риски, которые не были просчитаны изначально – это недостаточная мотивация целевой группы. Некоторые показатели участия были ниже, чем планировалось. Письма не предъявлены, но места проведения (по фото) мероприятий указывают на участие партнеров. Информация о проекте представлена на сайте КГБУСО «Краевой центр семьи и детей» http://kcsd24.ru/vukhod-iz-labirinta/o-proekte.html , Информация о сайте организации-заявителя не найдена.	30
г. Красноярск	г. Красноярск	Здоровая семья – здоровый край	Красноярская местная общественная организация содействия молодежным и творческим инициативам	Детский карнавал	Данные оценки выставлены основываясь на анкете руководителя, презентации (предоставленной при защите проекта) и словах организатора/руководителя Тетереной С.В. Независимых источников информации не предоставлено. Охват благополучателей (положительные отзывы) и другие показатели анализировались по информации из СМИ (3 источника) в сети интернет, анкете руководителя, презентации (предоставленной при защите проекта) и слов организатора/руководителя Тетереной С.В. Работа с местным сообществом и партнерами организацией проведена должным образом в соответствии с договором. Информация о отзывах благополучателей взята из публикаций в СМИ (сети интернет, 3 источника), подавляющее большинство отзывов положительные. Включенность грантополучателя в само мониторинг нулевая (информация на 27.10.2018 г.)	29
г. Красноярск	г. Красноярск	Экологическое партнерство	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Экологический патруль	В качестве отчетных документов, подтверждающих реализацию мероприятий проекта был представлен фотобанк с мероприятий, отзывы, ссылка на информационные ресурсы проекта (https://vk.com/sibirskietropi), видео. Списки участников представлены не были, исходя из чего сложно сделать вывод о том, сколько реально человек приняли участие в проекте (150 согласно презентации). В содержательной части проекта произошли изменения в части мест уборки и сплава, не согласованные с Грантодателем, по которым дана соответствующая рекомендация. Также несогласованные изменения произошли в части сметы. Проект несомненно нужный и актуальный для территории Красноярского края. Однако я считаю, что для подобных целей технология волонтерских рейдов не является инновационной и максимально эффективной. Также она имеет недостаток – требуется значительный объем финансирования для организации рейдов волонтерских команд в отдаленные территории. Из отчетов также не был ясен механизм отбора волонтеров в рейды, а также не были представлены договоры с волонтерами. Проект в целом и данная технология волонтерских рейдов имеет значительные риски, и не все из них были учтены/прописаны в договоре. Считаю необходимым модернизировать/оптимизировать технологию при проектировании дальнейших заявок. Проект партнерский. Работа с ними подтверждена. В ходе проекта привлекли 150 волонтеров согласно презентации. 14 - прошли аттестацию на экологических инспекторов. Проект на среднем уровне освещен в информационном пространстве. Ссылки на грантовую программу практически отсутствуют.	27
II группа	Манский район	Экологическое партнерство	Фонд поддержки социально-экономического развития «РОСТ»	Заманье – центр экологического туризма и краеведения	Представленные содержательные документы не позволяют сделать вывод о полном достижении заявленных результатов. Также есть изменения в проекте в содержательной и финансовой части. По итогам анкетирования руководителя, публичной отчетности по факту реализации проекта и проверки отчетных документов можно сделать вывод о реализации проекта на момент проверки на 80 процентов. За период реализации проекта была создана группа в социальной сети Вконтакте (на момент мониторинга более 20 постов, более 220 участников). Указания на грантовую программу есть всего в 1 публикации в группе. Также представителем организации представлен экземпляр газеты «Манская жизнь» со статьей о проекте. Поиск в интернете по названию проекта не дал результатов (не было информации в СМИ).	27

VII группа	Иланский район	Доброе сердце	Благотворительный фонд местного сообщества Иланского района «Благо Дарю»	История одного города	Цель реализации проекта «формирование и сохранение исторического наследия через волонтерскую деятельность подростков и молодежи»; не подтверждена. Сложно оценить на сколько сформировалось и сохранилось историческое наследие без механизмов оценки, следовательно сложно оценить социальную эффективность проекта по факту его реализации	26
V группа	Кежемский район	Социальная поддержка	Автономная некоммерческая организация «ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»	Тутти	Организация предоставила все отчетные документы, в рамках договора о предоставлении Краевого социального гранта. В рамках мониторинга не предоставила только анкеты благополучателей и партнеров. аомониторинг организация вела. Публикации в сети интернет соответствуют заявленным в договоре.	26
IV группа	Краснотуранский район	Гражданское общество	Местная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив Краснотуранского района «Перспектива»	ЭКОлёнок!	Запланированные результаты были достигнуты. В презентации и по спискам указано один в один запланированное и достигнутое количественное выражение показателя. Анкеты от благополучателей не были представлены. Из приобретений - только расходные материалы. Волонтеры в проекте не предполагались. Из вклада партнеров - 10 000 руб - аренда библиоавтобуса. Вклад не подтвержден на момент мониторинга. О проекте найден 1 новость на сайте библиотеки.	26
II группа	Ужурский район	Социальная поддержка	Ужурская районная местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	Вместе мы можем ВСЕ! - спортивная площадка для занятий адаптивной физической культурой в городе Ужуре	сроки сдвинуты, мероприятия не все проведены. В целом проект востребован целевой аудиторией, но он инфраструктурный, мероприятия разрозненные, придуманы с целью оправдания расходов на площадку. Нет сомнений, что площадку будут развивать далее, как заявлено командой проекта, привлекаться новые ресурсы и силы. Но она будет использоваться в интересах учреждений.	26
III группа	г. Назарово	Защищенное детство	Местная общественная организация по социальному развитию «Созидание» Назаровского района Красноярского края	Создание «Центра развития и творчества»	На момент проведения мониторинга выполнены не все плановые показатели проекта.	25
VII группа	г. Канск	Экологическое партнерство	Красноярская региональная общественная молодежная экологическая организация	Великий зелёный поход... начни с себя!	не было предоставлено содержательных документов, не возможно сделать вывод без документов	22
г. Красноярск	г. Красноярск	Экологическое партнерство	Красноярская региональная общественная организация «Красноярский краевой клуб спелеологов»	Сохранить и приумножить!	Объективные данные организация не предоставила. Поиск в независимом источнике, нечего не дал.	21

I группа	г. Железногорск	Здоровая семья – здоровый край	Красноярская региональная молодежная общественная организация «Федерация Здорового Образа Жизни»	Научись спасать жизнь!	По итогам анкетирования руководителя, публичной отчетности по факту реализации проекта, проверки документов можно сделать вывод о реализации проекта на 70%. Не все количественные показатели достигнуты на текущий момент (из 5600 школьников только 4800 прошли обучение в проекте, из 800 студентов ССУЗов – только 400, из 2500 участников летних лагерей – только 1900 человек. Также не отражено достигнут ли результат – 2 сюжета на ТВ. Остальные показатели достигнуты в полном объеме (50 волонтеров обучены, все мероприятия были проведены). Оценить эффективность реализации проекта в полной мере не представляется возможным ввиду отсутствия подтверждающих документов в содержательной части. Оценить эффективность реализации проекта в полной мере не представляется возможным ввиду отсутствия подтверждающих документов в содержательной части. Добровольцы были вовлечены в качестве инструкторов. Соглашение представлено только от администрации ЗАТО Железногорск (оказание информационная и консультационная поддержка) и МКУ «Молодежный центр». По данным соглашения со слов руководителя работа велась. В рамках самомониторинга экспертом 1 этапа было отмечено, что отчеты не размещены в личном кабинете. В время очного мониторинга ситуация не изменилась. Информационные материалы о проекте размещены в группе организации в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/learn_to_save_a_life) – несколько публикаций без ссылок на грантовую программу.	20
г. Красноярск	г. Красноярск	Здоровая семья – здоровый край	Красноярская региональная общественная организация содействия развитию кадетского и Мариинского движения «Северный крест»	Путёвка в жизнь через кадетство	Основанием для оценки проекта являлась анкета руководителя и презентация. Со слов руководителя из 15 человек поступили в учреждения кадетской и женской гимназической системы только 10, 17 участников проекта в режиме ожидания (списки обновляются раз в четверть), поэтому к концу проекта есть вероятность увеличения числа поступивших участников проекта. Сделать объективные выводы о реализации проекта в части проведения мероприятий, охвата благополучателей и расходования средств невозможно без содержательных и финансовых документов. По итогам анкетирования руководителя и публичной отчетности по факту реализации проекта, общения с партнерами и благополучателями можно сделать вывод об успешной реализации проекта. Однако, учитывая что содержательные и финансовые документы представлены не были, объективность этого вывода под сомнением. Руководитель был готов предоставить все необходимые документы в электронном виде (в том числе и заполненные анкеты), но по состоянию на 30 ноября документы представлены не были. Поэтому оценить социальную эффективность проекта невозможна. Связи с партнерами были выстроены до начала реализации проекта, отработаны в соответствии с соглашениями по словам руководителя организации. Отчеты о мероприятиях заполнены не полностью, отчетные материалы почти не представлены.	20
IV группа	Каратузский район	Доброе сердце	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Каратузского района	И стар и млад - спорту рад	В ходе защиты проекта, по договору № 16г были представлены: презентация (установленного образца), анкета руководителя, фотоматериал по проекту, аналитические, и финансовые документы. Основываясь на предоставленных документах возможно сделать вывод: По финансовым документам: В сумму стоимости тренажеров заложена их транспортировка до места монтажа (в смете данный расход не предусмотрен). Поздняя установка уличного тренажерного оборудования (со слов Ковтун Л.М. – ноябрь 2018 г.). По аналитическим документам: Не велась юридическая работа с добровольцами (договора, волонтерские книжки отсутствуют). У организации отсутствует системная работа по сбору, обработке и хранению персональных данных. Проекта реализуется, уведомление грантодателя по задержке установки уличных тренажеров отсутствует.	17

V группа	Богучанский район	Социальная поддержка	Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Богучанского района	Активно жить - здоровым быть!	<p>Нормативно-правовые документы по проекту – договор и заявка у грантополучателя в наличии. Из разговора с Мудрак Т.В.: Не велась юридическая работа с добровольцами (договора, волонтерские книжки отсутствуют). У организации отсутствует системная работа по сбору, обработке и хранению персональных данных. Рекомендации по устранению выявленных недочетов представитель организации обещает принять во внимание при подготовке итогового отчета. Письма поддержки не предоставлены, установить велась ли работа, не представляется возможным. Установить наличие закупки основных средств не представляется возможным, организация подтверждающие документы не предоставила. Со слов Мудрак Т.В. закупка произведена. Самомониторинг организация на момент мониторинга ведет не в полном объеме. В рамках мониторинга организации были высланы анкеты для обратной связи по работе с целевой аудиторией и партнерами. К установленному сроку (19.11.2018 г.) анкеты не получил.</p>	16
V группа	Богучанский район	Защищенное детство	Фонд Содействия и развития «Футбольно-хоккейного клуба «Ангара»	Спортивное наставничество	<p>Нормативно-правовые документы по проекту – договор и заявка у грантополучателя в наличии. Из разговора с Мудрак Т.В.: Не велась юридическая работа с добровольцами (договора, волонтерские книжки отсутствуют). У организации отсутствует системная работа по сбору, обработке и хранению персональных данных. Рекомендации по устранению выявленных недочетов представитель организации обещает принять во внимание при подготовке итогового отчета. Письма поддержки не предоставлены, установить велась ли работа, не представляется возможным. Установить наличие закупки основных средств не представляется возможным, организация подтверждающие документы не предоставила. Со слов Мудрак Т.В. закупка произведена. Самомониторинг организация на момент мониторинга ведет не в полном объеме. В рамках мониторинга организации были высланы анкеты для обратной связи по работе с целевой аудиторией и партнерами. К установленному сроку (19.11.2018 г.) анкеты не получил.</p>	16
г. Красноярск	г. Красноярск	Экологическое партнерство	Благотворительный фонд «Принеси пользу»	Образовательная программа «Первый молодежный экологический штаб»	<p>В ходе защиты проекта, по договору № 7эг были представлены: презентация (установленного образца), фотоматериал по проекту, аналитические, и финансовые документы, анкету руководителя организация не предоставила. По финансовым документам: Предоставлены не полные пакеты первичных финансовых документов (отсутствуют счета, платежные поручения, авансовые отчеты и т.п.). По ряду статей имеет перемещение средств (дополнительное соглашение и письмо-уведомление грантодателя отсутствует). По аналитическим документам: Организация предоставила не полный пакет документов отраженных в договоре о предоставлении Краевого социального гранта (отсутствуют аналитические справки). Самомониторинг на сайте http://grantmonitoring.ru организация ведет не в полном объеме. Рекомендации по устранению выявленных недочетов представитель организации обещает принять во внимание при подготовке итогового отчета. В рамках мониторинга организации были высланы анкеты для обратной связи по работе с целевой аудиторией и партнерами. К установленному сроку (19.11.2018 г.) анкеты организация не предоставила.</p>	15

г. Красноярск	г. Красноярск	Здоровая семья – здоровый край	Молодёжная оборонная спортивно-техническая региональная общественная организация «Патриот» Красноярского края	Дети и их родители	Проект на момент мониторинга реализуется с нарушениями: целевая группа меньше заявленной, представленные документы (финансовые и аналитические) выполнены с нарушениями или вообще отсутствуют, сроки проведения мероприятий не соответствуют срокам отраженным в организационном плане проекта, поставленные цели и задачи проекта достигнуты не в полном объеме (отсутствует прямая работа с целевой группой, а именно улучшению взаимодействия подростков с родителями - заявленная цель в проекта). Деятельность по проекту является основной деятельностью организации. Партнеры по проекту есть, но задействованы минимальным образом. Самомониторинг не ведется, мероприятия освещаются в официальной группе социальной сети в ВКонтакте и на официальном сайте проекта.	13
г. Красноярск	г. Красноярск	Красноярская идентичность	Красноярская региональная общественная организация содействия развитию птицеводства и животноводства «Сибирское подворье»	Секреты молока	Показатели отраженные в условии договора на момент мониторинга подтверждены на 30 %. Полного объяснения грантополучатель не предоставил. Ряд документов (списки, аналитические отчеты) грантополучатель не предоставил, а в предоставленных документах имелись нарушения (отсутствовала дата, обратная связь, документы не заверена). Из пяти организаций партнеров, анкеты предоставили только две. Информация публиковалась в официальной группе соц. сети «ВКонтакте» и СМИ телекомпания «Прима-ТВ».	12
I группа	г. Железногорск	Социальная поддержка	Автономная некоммерческая организация Железногорский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых»	Оказание паллиативной помощи на дому	Не представлены документы, не произошло встречи с проектной командой - не возможно дать объективную оценку эффективности проекта. Был изучен сайт заявителя http://hospice26.ru/ , группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public157100376 , а также другие источники http://миамир.пф/blago/43521 , которые указывают на активное участие авторов проекта в различных международных конференциях и полученных наградах за проект «Создание мобильного хосписа в Железногорске». Проект получил поддержку президентского фонда. Также указан проект 2017 года проекта «Домашний хоспис» и ещё один проект, поддержанный президентский фондом «Мобильный хоспис» https://vk.com/public157100376?w=wall-157100376_168 . Однако, не представлены списки благополучателей, анкеты, не удалось побывать на месте реализации проекта. Сложно оценить эффективность. Информация о проекте присутствует, но логотип программы «Партнерство» встречается не везде.	11
г. Красноярск	г. Красноярск	Экологическое партнерство	Некоммерческое партнерство «Красноярский Центр Иппотерапии»	Познание начинается с удивления	Не доступны материалы по проекту. Провести экспертизу качества реализации не представляется возможным. Не доступны материалы по проекту: не представлены отчеты на сайте, не направлены по запросу. Провести экспертизу качества реализации не представляется возможным.	10
IV группа	Курагинский район	Гражданское общество и библиотека	Красноярская региональная общественная организация поддержки многодетных семей «Новый день»	Игра в Жизнь	оценить невозможно проект только начал реализовываться	1
